



RDOWEB

Obras **sob controle**

SEÇÕES DE FORMULÁRIO CONTROLADO

INSTRUÇÕES:

Utilize esse documento para compor o modelo de formulário PDF ideal ao seu empreendimento.

Cada uma das seções apresentadas aqui podem ser mescladas à outras, para criar um novo modelo de impressão

The image displays a collage of various construction report forms. The central focus is a 'RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS' (Daily Work Report) for project 'PARADA G-200: PROJETO TIE-INS.' dated 29.05.2019. This form includes sections for project details, financials, work status, and a detailed list of activities performed. Other visible forms include 'DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - POR INTERVALO DE HORAS' (Atmospheric discharges) and 'ATIVIDADES REALIZADAS' (Activities performed).

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS												
FRM-RDO-MD versão 2		Obrs: PARADA G-200: PROJETO TIE-INS.		Projeto: TIE-INS BAS505F		Data: 29.05.2019						
Valor original: R\$ -		Valor aditivado: R\$ -		RDO n.º: RDO.0020-TIE-INS BAS505F								
Cliente: BASF		Unidade: Guaratinguetá		Gestor:								
Prazo: 35 dias		Prazo incorrido: 20 dias		Prazo restante: 15 dias		Início: 10/05/2019		Término: 14/06/2019		Modalidade contratual: P.U. / H.H.		
Pluviosidade: 0 mm		Condições da área: Operável		Houve acidente?: Não		Interrupção trabalho: Não		Status: consolidado		Contratada: SGS do Brasil Ltda.		
ACIDENTE			EFETIVO			EQUIPAMENTOS						
Com afastamento no dia			0			Indireta (MOI)			-			
Com afastamento ausentes hoje			0			Direta (MOD)			105			
Com afastamento acumulado obra			0			Subcontratados (MOD/MOI)			299			
Sem afastamento no dia			0			Ausentes			8			
Sem afastamento acumulado obra			0			Efetivo total			404			
Mobilizados			17			Subcontratados mobilizados			177			
Total			194									
PARALISAÇÕES												
0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h Total 2h												
X X												
ATIVIDADES REALIZADAS												
ID-1	Identif.	Descrição							UN	QT		
ID-1	PRODUÇÃO: Mecânica	COMENTÁRIO: Tie-IN 06-01 (510.003): cortar linha e instalar GAP com uso de solda elétrica. Tie-IN: 06-02 (1007.002): cortar linha e instalar GAP com uso de solda elétrica. Tie-IN 05-06 (401.115): cortar e modificar tubulação com solda.							VB	-		
ID-1.1.3	PRODUÇÃO: Montar Andaime	COMENTÁRIO: montagem de 3,6 m³ no piso 18 m. Desmontagem de 6,12 m³ e 4,32 m³ no piso 6 m, e 7,2 m³ no piso 18 m.							VB	-		
ID-2.9.1.1	PRODUÇÃO: Desenergização /energização	COMENTÁRIO: Energização da PM-2088 no piso 6 m; da PM-129 no piso 6 m. Desenergização da PM-161 no piso 6 m. Desconexão de cabo de HVK-4901 e da P-4905. Retirada de 32 m de cabo da HVK-4901, de 1,5 m da B-1200, de 1,5 m da B-1250, de 4 m da B-1200 e B1250.							VB	-		
EFETIVO DIRETO												
Função	Tipo	Mobilizado	Presente	Falta	HN	HE	HN	HE				
AJUDANTE	MOD	-	2	0	17,6	0	329	8				
ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE	MOD	-	1	0	8,8	0	114,4	0				
ENCANADOR	MOD	-	1	0	8,8	0	168,6	0				
MONTADOR DE ANDAIME	MOD	-	4	0	35,2	0	365,2	0				
PEDREIRO	MOD	-	1	0	8,8	0	49,8	0				
SOLDADOR	MOD	-	1	0	8,8	0	49,8	0				



Seção de Atividades



Esse canal registra tarefas executadas providas do seu cronograma, EAP ou lista de Preços Unitários

ATIVIDADES



Opção 1:
Palavra “ATIVIDADES” pelo rótulo da área.

Comentários em texto livre
abaixo da atividade

Fotos e imagens em seguida,
duas por linha

ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL

Ref.	Identificador	Descrição	Intervalo (E+m)	Total (m)
005	4.2	Concreto magro E=5cm, preparo com betoneira (2 imagens) <i>COMENTÁRIO: Comentário obra....</i>		
				
				
006	4.3	Forma tabua p/concreto em fundacao s/reaproveitamento		
007	5.5	Chapisco traço 1:3 com 0,5cm de espessura, preparo manual		
008	13.6	Limpeza final da obra <i>COMENTÁRIO: Limpeza da área....</i>		

ATIVIDADES



Opção 2:
Palavra “ATIVIDADES” pelo rótulo da área.

Coluna de unidade e total realizado

Comentários em texto livre
abaixo da atividade

Fotos e imagens em seguida,
duas por linha

ATIVIDADES REALIZADAS

Identif.	Descrição	UN	QT
ID-200.4	PLANEJAMENTO: Fabricação de tubulações <i>Comentário: Início as 9:00.</i>	hh	10,00
ID-200.5	PLANEJAMENTO: Fabricação de suportes e estruturas (2 imagens)	hh	0,00



ATIVIDADES



Opção 3:
Palavra “SERVIÇOS DA QQP” pelo
rótulo da QQP utilizada.

Unidade, produção e horas nas
colunas à direita.

Comentários em texto livre
abaixo da atividade.

Fotos e imagens em seguida,
duas por linha

Administração Contratual					
Item	Item QQP	Descrição	Un	Produção	Horas
01	4.2	Desmobilização de pessoal e equipamentos (Desmobilização de canteiro de obras) [13,00h] (2 imagens)	VB	0,70	13,00
					
02	4.4	Mão de obra indireta [0,00h]	VB	0,50	0,00

ATIVIDADES



ATIVIDADES				
Ref.	Atividade	Área	Local	Quant.
001	Levantamento Topográfico <i>COMENTÁRIO: Jorcy, 2 colaboradores. (Em andamento).</i>	NCL_A1_P40	L123,L125,L127,L129	0,00
002	Levantamento Topográfico <i>COMENTÁRIO: Alisson, 2 colaboradores. (Em andamento)</i>	NCL_A1_P36	L031,L033,L035,L037,L039,L041,L043,L045	0,00
003	Levantamento Topográfico <i>COMENTÁRIO: Jorcy, 2 colaboradores.</i>	NCL_A1_P38	L003,L001	329,59
004	Caminhamento Elétrico (CE) <i>COMENTÁRIO: Rondinele, 7 colaboradores.</i>	NCL_A1_P30		624,00
005	Caminhamento Elétrico (CE) <i>COMENTÁRIO: Adrivan, 6 colaboradores. Lucas, 11 colaboradores.</i>	NCL_A1_P40	L039,L043,L127	813,00
006	Caminhamento Elétrico (CE) <i>COMENTÁRIO: Erick, 6 colaboradores. Jeferson, 8 colaboradores.</i>	NCL_A1_P34	L007,L011,L015,L055,L059	1.146,00
007	Caminhamento Elétrico (CE) <i>COMENTÁRIO: Laerte, 11 colaboradores</i>	NCL_A1_P36	L003	621,00

Opção 4:

Atividades descritas com os nomes representados por EAP e Descrição.

Separações da atividade por Área, Local e Quantidade.

Comentários em texto livre abaixo da atividade.

ATIVIDADES



Opção 5:


Palavra “ATIVIDADES” pelo rótulo da atividades realizadas.

Status (Executando e Executado) e Responsável na coluna a direita.

Comentários em texto livre abaixo da atividade.

Fotos e imagens em seguida, duas por linha

Atividades Realizadas - Atividades Frente 2

Ref.	Descrição	Status	Responsável
001	Mobilização de pessoal e equipamentos (Construção e mobilização de canteiro de obras) (2 imagens)	Executando	
			
002	Desmobilização de pessoal e equipamentos (Desmobilização de canteiro de obras)	Executando	
003	Deslocamento de pessoal e equipamentos (Manutenção do canteiro)	Executando	
004	Mão de obra indireta	Executando	

ATIVIDADES



Opção 6:


Palavra “ATIVIDADES” pelo rótulo da Área.

Campos de previsão com data inicial e final.

Com os quantitativos referente ao planejamento da semana

Comentários em texto livre abaixo da atividade.

Fotos e imagens em seguida, duas por linha

ATIVIDADES - Adm. Contratual					Previsão			Semana			Total
Item	Código	Descrição	UN	Exec.Dia	Inicio	Final	Qt.Total	Planej.	Acum.	Exec.	Exec.
01	1466	Estaca tipo Hélice Contínua d= 30 cm	%	0,20	08/08/24	09/08/24	1,0		0,2		20,00%
02	894	Esquadrias e artefatos metálicos.	%	0,20	28/11/24	03/12/24	1,0		0,2		20,00%
03	1476	Filme de Polietileno (esp.=0,2mm) Duplo	%	0,40	26/09/24	27/09/24	1,0		0,4		40,00%
04	1458	FUNDO (2 imagens)	%	0,40	17/01/25	23/01/25	1,0		0,4		40,00%
											
05	658	Estaca tipo Hélice Contínua Monitorada d = 30 cm, fck=40MPa	%	0,90	24/09/24	26/09/24	1,0		0,9		90,00%

ATIVIDADES



Opção 7:

Palavra “ATIVIDADES REALIZADAS”
conforme cronograma

Campo com executado e acumulado
anterior referente a atividade.

Planejamento diário na coluna a
direita.

Comentários em texto livre
abaixo da atividade em campo
separado por área.

ATIVIDADES

PRODUÇÃO

Ref.	Item	Descrição	Unid.	Total
001	1.15	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL [224M3] (1 imagem) <i>COMENTÁRIO: Nivelamento do aterro bota espera Est. 61985, Km 406</i>	*	0,00



*Escavação, carga e transporte de material
3ª cat Est. 61985, Km 406*

ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL

Ref.	Item	Descrição	Unid.	Total
004	1.603	Vigilância patrimonial. <i>COMENTÁRIO: Sinalização de obras ao longo da rodovia. Período diurno e noturno.</i>	*	0,00

ATIVIDADES



ATIVIDADES REALIZADAS

DISCIPLINA: CIVIL

Atividade: Concreto estrutural - fck=40 Mpa (1 imagem)

Comentário: Concretagem



Concretagem

Atividade: REVESTIMENTO DE PISO

Atividade: Forro metálico em Isopaionel.

Atividade: FUNDAÇÃO, MURO DE ARRIMO E CAIXA

Opção 8:

Palavra “ATIVIDADES REALIZADAS” com identificadores a disciplina referenciado.

Comentários em texto livre abaixo da atividade em campo.

Descrição da atividade com opcional com a referência a equipe que a realizou.

ATIVIDADES



Opção 9:

Palavra “ATIVIDADES REALIZADAS”
com identificadores a área.

Comentários em texto livre ao lado da
atividade em campo, podendo ser
inserido imagens.

Comentários do cliente em texto livre
ao lado da atividade em campo.

Descrição da atividade com
identificador EAP ao lado.

ATIVIDADES - Adm. Contratual

Ref.	Identificador	Descrição	Comentários Cliente	Qt. Pessoas
1	1046	<p>Escavação manual/mecanizada (1 imagem)</p> <p>COMENTÁRIO: A equipe informa que a atividade está de acordo com com o cronograma, seguindo o planejado de acordo com o escopo do projeto.</p> 	<p>1- A Engenharia está de acordo com as informações inseridas.</p> <p>2-A Gerência informa que ambas as partes estão de acordo.</p>	3

ATIVIDADES



ATIVIDADES REALIZADAS

OS: Atividades MOI

Grupo: Equipe de Gestão

Atividade: Administrativo

Equipe: 1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Atividade: Técnico de Segurança

Equipe: 1 TEC SEGURANÇA DO TRABALHO

Atividade: Técnico de Materiais

Equipe: 1 TECNICO DE MATERIAIS

Atividade: Atividades MOI - Apoio à Gestão

Equipe: 1 MESTRE DE TUBULAÇÃO, 1 SUPERVISOR DE MECÂNICA

OS: ENG-SSE-01508-4

Grupo: Mecânica / Tubulação / Caldeiraria

Atividade: DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

Comentário: Em andamento: Apoio a manutenção parada Alpek - PTA/CTA.

Permissão de trabalho: 26874 - Solicitado 08:00 | Liberação 08:10

Equipe: 3 CALDEIREIRO, 1 MESTRE DE TUBULAÇÃO, 1 PINTOR, 1 PINTOR INDUSTRIAL, 3 SOLDADOR TIG

Atividade: MONTAGEM DE TUBULAÇÃO

Comentário: Em andamento: montagem de figuras 8 na sucção das bombas G1-173A/B - CTA.

Permissão de trabalho: 26875 - Solicitado 12:30 | Liberação 13:40

Equipe: 2 CALDEIREIRO

Grupo: Montagem de Andaime

Atividade: MONTAGEM DE ANDAIME

Comentário: Em andamento: Apoio a manutenção. Montagem e desmontagem de andaime -PTA/CTA(Parada).

Equipe: 1 AJUDANTE, 1 MESTRE DE TUBULAÇÃO, 5 MONTADOR DE ANDAIME

Opção 10:

Palavra “ATIVIDADES REALIZADAS”
com identificadores de Ordem de
Serviço e grupo.

Histograma de cargos acoplados as
atividades.

Comentários em texto livre
abaixo da atividade em campo.

ATIVIDADES



Opção 11:

Palavra “ATIVIDADES” com ÁREA.

Adição de Unidade e Total.

Comentários em texto livre
abaixo da atividade em campo.

ATIVIDADES - PLANEJAMENTO

Ref.	Identificador	Descrição	Unid.	Total
001	1.9.2	Regularização de pista/ Inversão Greide e leira transversal/ longitudinal COMENTÁRIO: início às 8:30 e termino as 15:17	m	212,00
002	1.9.3	Construção de Leiras COMENTÁRIO: início às 8:30 e termino as 15:17	m	20,00
003	1.16.3	Execução de cerca de arame liso COMENTÁRIO: início às 8:30 e termino as 15:17	m	30,00
004	2.1.1	Deslocamento da equipe (HOTEL X FRENTE DE SERVIÇO) COMENTÁRIO: 7:00 as 7:35	%	0,00
005	2.1.2	Deslocamento da equipe (FRENTE DE SERVIÇO x HOTEL) COMENTÁRIO: início às 15:25 e termino as 16:00	%	0,00
006	2.1.3	Realização de atividades de segurança (DDS, APRD, etc) COMENTÁRIO: início às 7:40 e termino as 8:15	%	0,00
007	2.1.5	Horário de Almoço COMENTÁRIO: início às 12:00 e termino as 13:00	%	0,00

ATIVIDADES



ATIVIDADES REALIZADAS

1. ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL

Ref. Identificador / Descrição / Status

1.1 Execução de A/C [Status: Não informado] (2 imagens)

Comentário: Atividade teve início as 09:00



1.2 Montagem de esquadrias in loco [Status: Não informado]

1.3 Montagem de painéis pré fabricados em offsite [Status: Não informado]

2. ENGENHARIA

Ref. Identificador / Descrição / Status

2.1 Montar o piso (Porcelanato / cerâmica) [Status: Não informado]

2.2 Montar o piso (Vinílico)
[Status: Não informado]

Opção 12:
Palavra “ATIVIDADES REALIZADAS”
pelo rótulo da área.

Identificador de Status da atividade

Comentários em texto livre
abaixo da atividade

Fotos e imagens em seguida,
duas por linha

ATIVIDADES



Opção 13:
Palavra “ATIVIDADES” pelo rótulo da Área.

Identificador de OS, Área, Jornada, Classe, Status e Comentário

Coluna de Comentários em texto livre

Fotos e imagens em seguida, duas por linha

ATIVIDADES							
Item	OS	Área	Atividade	Jornada	Classe	Status	Comentário
5.1	1281	VV2-VV3	LIMPEZA COM JATO D'AGUA	TURNO NOTURNO	ABERTA NA ÁREA	SATISFATÓRIO	Atividade realizada com sucesso sem interferência
5.1	1263	TM 122	LIMPEZA COM JATO D'AGUA	TURNO DIURNO	ROTINA	SATISFATÓRIO	Atividade realizada com sucesso sem interferência
5.1	1262	AMOSTRAGEM	LIMPEZA COM JATO D'AGUA	TURNO DIURNO	ROTINA	SATISFATÓRIO	Atividade realizada com sucesso sem interferência
1	1260	VV1-VV2-VV3	5S E ORGANIZAÇÃO	TURNO DIURNO	ROTINA	SATISFATÓRIO	Atividade realizada com sucesso sem interferência
5	1276	AMOSTRAGEM	LIMPEZA COM JATO D'AGUA	TURNO NOTURNO	ROTINA	SATISFATÓRIO	Atividade realizada com sucesso sem interferência
	1282	VV1	LIMPEZA COM FERRAMENTA	TURNO NOTURNO	ABERTA NA ÁREA	SATISFATÓRIO	Atividade realizada com sucesso sem interferência
	1261	ECV	LIMPEZA COM FERRAMENTA	TURNO DIURNO	ROTINA	SATISFATÓRIO	Atividade realizada com sucesso sem interferência
	1259	VV2-VV3	LIMPEZA COM FERRAMENTA	TURNO DIURNO	ROTINA	SATISFATÓRIO	Atividade realizada com sucesso sem interferência
	1265	PIER / BERÇO 101	LIMPEZA COM FERRAMENTA	TURNO DIURNO	ROTINA	SATISFATÓRIO	Atividade realizada com sucesso sem interferência
	1266	PIER / BERÇO 102	LIMPEZA COM FERRAMENTA	TURNO DIURNO	ROTINA	SATISFATÓRIO	Atividade realizada com sucesso sem interferência

ATIVIDADES




Opção 14:
Palavra “ATIVIDADES” pelo rótulo da Área.

Coluna de unidade e total realizado

Comentários em texto livre
abaixo da atividade

Fotos e imagens em seguida,
duas por linha

ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL

Ref.	Identificador	Descrição	Unid.	Total
001	9.2/9.3	Execução de A/C (2 imagens) COMENTÁRIO: Atividade teve início as 09:00	Un	10,00
				
002	9.2/9.3	Montagem de esquadrias in loco	Un	0,00
003	9.2/9.3	Montagem de painéis pré fabricados em offsite	Un	0,00

ATIVIDADES



Opção 15:
Palavra “ATIVIDADES REALIZADAS”
pelo rótulo do Quadro.

Identificação da Área dentro da
descrição da atividade

Coluna de unidade e quantidade
realizado

Comentários em texto livre
abaixo da atividade

Fotos e imagens em seguida,
duas por linha

ATIVIDADES REALIZADAS

Identif.	Descrição	UN	QT
ID-9.2/9.3	ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL: Execução de A/C (2 imagens) <i>Comentário: Atividade teve início as 09:00</i>	Un	10,00
			
ID-9.2/9.3	ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL: Montagem de esquadrias in loco	Un	0,00
ID-9.2/9.3	ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL: Montagem de painéis pré fabricados em offsite	Un	0,00
ID-9.1	ENGENHARIA: Montar o piso (Porcelanato / cerâmica)	m ²	12,00
ID-9.2	ENGENHARIA: Montar o piso (Vinílico)	m ²	0,00

ATIVIDADES



Opção 16:

Palavra “DESCRIBÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA” pelo rótulo do Quadro.

Identificação da Área e Classe da O.S

Primeira coluna representa a frente de serviço.

Cada coluna representa uma atividade cadastrada no banco de dados.

Comentários em texto livre abaixo da atividade

DESCRIBÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA

PRODUÇÃO							
Área externa							
FRENTE	CARREGAMENTO	MARCAÇÃO	ABATIMENTO DE CHOCO	DETONAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PERFURAÇÃO	LIMPEZA
O.S-0001	Atividade teve início as 09:00	Atividade teve início as 07:00		Atividade teve início as 11:30		Atividade teve início as 08:30	

ATIVIDADES



Opção 17:

Palavra “ATIVIDADES” pelo rótulo da área.

Identificador de Área/Subárea

Tipo (descrição da atividade)



Área equivalente (m²)

Coluna de Comentários em texto livre

Coluna de Ponderação (Iniciado, Em andamento e Encerrado)

Fotos e imagens em seguida, duas por linha

ATIVIDADES

Item	Área/subárea	Tipo	m ²	Jornada	Comentário	Ponderação
9.2/9.3	ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL	Execução de A/C (2 imagens)			Atividade teve início as 09:00 </p>	Iniciado
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						
9.1	ENGENHARIA	Montar o piso (Porcelanato / cerâmica)				Iniciado
9.2/9.3	ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL	Montagem de esquadrias in loco				Iniciado
9.2/9.3	ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL	Montagem de painéis pré fabricados em offsite				Iniciado



Seção de Efetivos



Esse canal registra quadro de mão de obra do efetivo de forma a ser nominal ou por cargos, incluindo mão de obra direta ou indireta.

MÃO DE OBRA



Opção 1:

Palavra “EFETIVO” pelo rótulo com cargos detalhados. A opção junta ambos os quadros de equipamentos ao de efetivo.

Coluna demonstrando o cargo e a quantidade apropriada do mesmo.

Quantidade de efetivo total apropriado em duas divisões MOD (Mão Obra Direta) & MOI (Mão Obra Indireta)

EFETIVO - QUADRO DETALHADO						EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS		
-	Cargo	MOI MOD	Quant	Cargo	MOI MOD	Quant	Descrição	Quant
1	1/2 Oficial de Pedreiro	MOD	1	Acabador de Drywall	MOD	2	AUTO-BETONEIRA	1
2	Ajudante Geral	MOD	3	Ajudante Operação	MOD	1	Aspirador Água e Pó	1
3	Ajudante de Almoxarifado	MOD	1	Ajudante de Assentador	MOD	1	BOMBA DE SUCÇÃO	1
4	Ajudante de Eletricista	MOD	2	Ajudante de Estruturas Metálicas	MOD	6	BOMBA D'AGUA	1
5	Ajudante de Impermeabilização	MOD	3	Ajudante de Montagem	MOD	4	BOMBA SUBMERSA	1
6	Ajudante de Obras	MOD	5	Ajudante de Soldador	MOD	5	Betoneira elétrica 600	1
7	Almoxarife	MOI	5	Analista Administrativo	MOI	2	Bob Cat -com pá	1
8	Analista Administrativo de Obras	MOI	4	Analista Administrativo e Financeiro	MOI	2	CAMINHÃO	1
9	Analista RH de Obra	MOI	4	Analista de Apoio Técnico	MOI	3	CAMINHÃO BASCULANTE 12M³	1
10	Analista de Compras	MOI	3	Analista de Comunicação e Marketing	MOI	2	CAMINHÃO BASCULANTE 16M³	1
11	Analista de Contratos	MOI	8	Analista de Controle Técnico	MOI	6	CAMINHÃO BASCULANTE 6X4	1
12	Analista de Planejamento	MOI	6	Analista de Projetos	MOI	1	CAMINHÃO BASCULANTE 8X4	1
13	Analista de RHU	MOI	3	Analista de Suprimentos	MOI	5	CAMINHÃO BASCULANTE SCANIA P124	1
14	Apontador	MOI	3	Apropriador	MOI	2	CAMINHÃO BETONEIRA 6X4R 8M3	2
15	Armador	MOD	4	Arquiteto	MOI	3	CAMINHÃO CARROCERIA MBB 1314	2
16	Arquiteto de Apoio Técnico	MOI	4	Arquiteto de Projetos	MOI	3	CAMINHÃO CARROCERIA 4X4	1
17	Asfaltador/ Rasteleiro	MOD	3	Assentador de Pisos	MOD	3	CAMINHÃO CARROCERIA F350 CD	1
18	Assistente Administrativo	MOI	2	Assistente Administrativo de Obras	MOI	2	CAMINHÃO CARROCERIA FORD F4000 4X4	2

MÃO DE OBRA



Opção 2:

Palavra “SUBCONTRATADA” pelo rótulo com cargos que estejam atribuídas a elas.

Coluna demonstrando a subcontratada e a quantidade de efetivo total dela, independente do cargo.

EFETIVO MOI - ENGENHARIA S.A		
Item	Cargo	Quantidade
01	Analista Administrativo de Obras	1
02	Analista Administrativo e Financei	2
03	Analista RH de Obra	2
-	TOTAL INDIRETO	5
EFETIVO MOD - ENGENHARIA S.A		
Item	Cargo	Quantidade
01	Acabador de Drywall	2
02	Ajudante Geral	3
03	Ajudante Operação	3
04	Ajudante de Almoxarifado	2
-	TOTAL DIRETO	10
EFETIVO SUBCONTRATADA		Quantidade
01	COMPANHIA DO PARANÁ	12
-	TOTAL EFETIVO SUBCONTRATADAS	12

MÃO DE OBRA



Opção 3:

Palavra “QUADRO DE MÃO DE OBRA” pelo rótulo com empresa.

Coluna com o T (Total Presente) e E (Quantidade de pessoas em hora extra)

Total de efetivo em MOD e MOI separados, e a somatória de ambos.

Quantidade de cargos distintos somados para demonstração.

QUADRO DE MÃO DE OBRA

Legenda: T - Total presente E - Quantidade de pessoas em hora extra MOD - Mão de obra Direta MOI - Mão de obra Indireta

EMPRESA S.A

FUNÇÃO		T	E	MOI/MOD	FUNÇÃO		T	E	MOI/MOD
01	1/2 Oficial de Pedreiro	1		MOD	02	Acabador de Drywall	1		MOD
03	Ajudante Geral	2		MOD	04	Ajudante Operação	3		MOD
05	Ajudante de Almoarifado	2		MOD	06	Ajudante de Assentador	2		MOD
07	Almoxarife	1		MOI	08	Analista Administrativo	1		MOI
09	Analista Administrativo de Obras	2		MOI	10	Analista Administrativo e Financeiro	2		MOI
11	Analista RH de Obra	2		MOI					
11 FUNÇÕES		11 MOD			8 MOI			GERAL:19	

MÃO DE OBRA



Opção 4:

Quadro de efetivos com o nome da empresa responsável.

Coluna com o Mob. (Mobilizado) e Prev. (Quantidade de pessoas previsto para o cargo) e Real (Quantidade atuante no diário).

Total de efetivo em MOD e MOI separados, e a somatória de ambos.

Quantidade de cargos distintos somados para demonstração.

Efetivo | Quadro detalhado

Legenda: MOD - Mão de obra Direta MOI - Mão de obra Indireta

EMPRESA S.A

Item	Cargo - MOD	Mob.	Prev	Real	HE	Item	Cargo - MOI	Mob.	Prev	Real	HE
01	1/2 Oficial de Pedreiro	8		7	0,00	01	Almoxarife	1		1	0,00
02	Acabador de Drywall	1		1	0,00	02	Analista Administrativo de Obras	1		1	0,00
03	Ajudante Geral	10		6	0,00	03					0,00
04	Ajudante Operação	37		28	0,00	04					0,00
05	Ajudante de Almoxarifado	2		2	0,00	05					0,00
Total MOD		58		44	0,00	Total MOI		2		2	0,00

MÃO DE OBRA



Opção 6:

Quadro de efetivos com o nome da empresa responsável, com subcontratada em baixo.

Colunas separadas em MOD, MOI e Real (Quantidade de efetivo atuando no diário).

Total de efetivo em MOD e MOI separados.

QUADRO DE EFETIVO

Legenda: MOD - Mão de obra Direta MOI - Mão de obra Indireta

EMPRESA S.A

MÃO DE OBRA - MOD

Real

MÃO DE OBRA - MOI

Real

01	1/2 Oficial de Pedreiro	7	01	Almoxarife	1
02	Acabador de Drywall	1	02	Analista Administrativo de Obras	1
03	Ajudante Geral	6	03		
04	Ajudante Operação	28	04		
05	Ajudante de Almoxarifado	2	05		
Total MOD		44	Total MOI		2

MÃO DE OBRA



Opção 7:

Quadro de efetivos com o nome da empresa responsável, com subcontratada em baixo.

Colunas separadas em MOD, MOI.

Real (Quantidade de efetivo atuando no diário), HE (Quantidade de pessoas em hora extra), Cont (Contratados) e Pres (Efetivos presente no diário)

Totais somados de MOD e MOI separados para cada coluna respectivamente

QUADRO DE EFETIVO

Legenda: MOD - Mão de obra Direta MOI - Mão de obra Indireta Cont - Contratada Pres - Presente HE - Quantidade de pessoas em hora extra

EMPRESA S.A

Item	MÃO DE OBRA - MOD	Cont	Pres	HE	Item	MÃO DE OBRA - MOI	Cont	Pres	HE
01	1/2 Oficial de Pedreiro	8	7		01	Almoxarife	1	1	
02	Acabador de Drywall	1	1		02	Analista Administrativo de Obras	1	1	
03	Ajudante Geral	10	6		03	Analista Administrativo e Financeiro	2	2	
04	Ajudante Operação	37	28		04	Analista RH de Obra	1	1	
05	Ajudante de Almoxarifado	2	2		05	Analista de Apoio Técnico	2	1	
06					06	Analista de Compras	2	2	
07					07	Analista de Comunicação e Marketing	5	4	
08					08	Analista de Contratos	4	2	
09					09	Analista de Controle Técnico	2	2	
Total MOD		58	44	0	Total MOI		20	16	0

MÃO DE OBRA



Opção 8:

Quadro de efetivos com identificador de Área, atribuído ao efetivo na hora de inserção do RDO.

Presente, quantidade de efetivos atuando na obra. HN (Hora Normal) e HE (Hora Extra) somados diferencialmente em 2 colunas.

Acumulado. HN e Acumulado HE. Somando o total de HN do efetivo desde o primeiro lançamento do RDO até o dia do lançamento do mesmo.

Área: Engenheira de Planejamento							Acumulado	
Função	Tipo	Mobilizado	Presente	Falta	HN	HE	Acum. HN	Acum. HE
1/2 Oficial de Pedreiro	MOD	0	1		10,00	0,00	40,00	0,00
Acabador de Drywall	MOD	0	2		20,00	0,00	50,00	0,00
Ajudante Geral	MOD	0	2		20,00	0,00	40,00	0,00
Ajudante Operação	MOD	0	1		10,00	0,00	20,00	0,00
Área: Fiscal de Obras							Acumulado	
Função	Tipo	Mobilizado	Presente	Falta	HN	HE	Acum. HN	Acum. HE
1/2 Oficial de Pedreiro	MOD	0	3		30,00	0,00	40,00	0,00
Acabador de Drywall	MOD	0	3		30,00	0,00	50,00	0,00
Ajudante Geral	MOD	0	2		20,00	0,00	40,00	0,00
Ajudante Operação	MOD	0	1		10,00	0,00	20,00	0,00
Total	-	0	15	0	150,00	0,00	300,00	0,00
EFETIVO INDIRETO								
Área: Gestor de contrato							Acumulado	
Função	Tipo	Mobilizado	Presente	Falta	HN	HE	Acum. HN	Acum. HE
Almoxarife	MOI	0	2		20,00	0,00	20,00	0,00
Analista Administrativo	MOI	0	2		20,00	0,00	20,00	0,00
Total	-	0	4	0	40,00	0,00	40,00	0,00

MÃO DE OBRA



Opção 9:

Quadro de efetivos com o nome da empresa responsável (Recurso Humanos (Próprio)) e empresas contratadas (Recurso Humanos (Subcontratados))

Janela de Horário de Trabalho contendo a somatória total de horas normais dos efetivos (MOD e MOI) e o acumulado semanal TOTAL delas.

Janela de Horário extra, contendo a somatória total de horas normais dos efetivos (MOD e MOI) e o acumulado semanal TOTAL delas.

Campo dividindo a atribuição de turnos, ausentes e o totais de efetivo presentes no diário. Em SUBCONTRATADAS, é inserido juntamente a empresa pertencente ao efetivo.

Horário de Trabalho										
Horas Normais					Horas Extras					
Diário:	193.60	Horas			Diário:	0.00	Horas			
Acumulado Semanal	2,332.00	HORAS			Acumulado Semanal	0.00	HORAS			
Recursos Humanos (Próprio)					Recursos Humanos (Sub-Contratados)					
Categoria	Período		Ausentes	Total	Categoria	Empresa	Período		Ausentes	Total
	Diurno	Noturno					D	N		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	0		1						
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	0		1						
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO	1	0		1						
ENCANADOR INDUSTRIAL	3	0		3						
ENCARREGADO DE MATERIAIS	1	0		1						
ENCARREGADO DE MECANICA	1	0		1						
ENCARREGADO DE SOLDA	1	0		1						
ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	1	0		1						
LIXADOR	3	0		3						
MEIO OFICIAL ENCANADOR	1	0		1						
MONTADOR DE ANDAIME	2	0		2						
OPERADOR DE MUNCK	1	0		1						
SOLDADOR	1	0		1						
SOLDADOR TIG	3	0		3						
TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	0		1						
TOTAL	22	0	0	22	TOTAL		0	0	0	0

MÃO DE OBRA



Opção 10:

Quadro de efetivos com o nome da empresa na coluna central, o tipo do efetivo (MOD & MOI), a quantidade de contratados no dia, quantidade de efetivos presente no diário em questão divididos por turnos.

Campo inferior mostrando a somatória de MOD e MOI, e a quantidade total de cada um, separados pela empresa representante (Contratada e Subcontratada)

QUADRO DE EFETIVO - MOD						
Legenda: MOI - Mão de obra indireta MOD - Direta						
ITEM	FUNÇÃO	EMPRESA	TIPO	DIURNO	NOTURNO	PREVISTO
1	1/2 Oficial de Pedreiro	EMPRESA S.A	MOD	1	1	
2	Acabador de Drywall	EMPRESA S.A	MOD	2	1	
3	Ajudante Geral	EMPRESA S.A	MOD	3		
Subtotal Contratada - MOD				6	2	0
Subtotal Subcontratada - MOD				0	0	0
TOTAL - MOD				6	2	0
QUADRO DE EFETIVO - MOI						
Legenda: MOI - Mão de obra indireta MOD - Direta						
ITEM	FUNÇÃO	EMPRESA	TIPO	DIURNO	NOTURNO	PREVISTO
1	Almoxarife	EMPRESA S.A	MOI	2		
2	Analista Administrativo	EMPRESA S.A	MOI	1		
3	Analista Administrativo de Obras	EMPRESA S.A	MOI	1		
Subtotal Contratada - MOI				4	0	0
Subtotal Subcontratada - MOI				0	0	0
TOTAL - MOI				4	0	0

MÃO DE OBRA



Opção 11:

Quadro de efetivos com o nome da empresa e local ao lado.

2 colunas contendo o nome do cargo com C (Contratante) variando conforme a atribuição, F (Faltas), T (Total) e E (Quantidade de pessoas em hora extra).

Coluna para identificar (MOD/MOI).

EFETIVO - QUADRO DETALHADO							Legenda: C - Cadastrado F - Faltas T - Total E - Pessoas em HE						
Empresa: EMPRESA S.A - Local: Frente A													
-	Cargo	C	F	T	E	MOI/MOD	-	Cargo	C	F	T	E	MOI/MOD
01	1/2 Oficial de Pedreiro	2		2		MOD	02	Acabador de Drywall	3		3		MOD
03	Ajudante Geral	4		4		MOD	04	Ajudante Operação	1		1		MOD
05	Ajudante de Almojarifado	2		2		MOD	06	Almojarife	2		2		MOI
07	Analista Administrativo	2		2		MOI	08	Analista Administrativo de Obras	4		4		MOI
09	Analista Administrativo e Financeiro	3		3		MOI	10	Analista RH de Obra	4		4		MOI
							-	Total	27	0	27	0	-

MÃO DE OBRA



Opção 12:

Quadro de efetivos e equipamentos com o nome da Área no topo.

O quadro de equipamentos a da direita.

Quantidade de efetivo						Equipamentos		
Área								
Item	Função	Empresa	Tipo	Previsto	Real	Descrição	Previsto	Real
0	1/2 Oficial de Pedreiro	EMPRESA S.A	MOD		1	AUTO-BETONEIRA -	0	1
1	Acabador de Drywall	EMPRESA S.A	MOD		1	Aspirador Água e Pó -	0	1
2	Ajudante Geral	EMPRESA S.A	MOD		2	BOMBA DE SUCÇÃO -	0	2
3	Ajudante Operação	EMPRESA S.A	MOD		1	CAMINHÃO	0	1
4	Ajudante de Assentador	EMPRESA S.A	MOD		2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0	2
5	Almoxarife	EMPRESA S.A	MOI		2	RETROESCAVADEIRA	0	2
6	ENGENHEIRO RESIDENTE	EMPRESA S.A	MOI		1			
7	Encarregado Geral	EMPRESA S.A	MOI		1			
TOTAL ÁREA				0	11	TOTAL ÁREA	0	9

MÃO DE OBRA



Opção 13:

Quadro de efetivos e equipamentos em dois quadros distintos com as seguintes divisões:

MOD e MOI para efetivos, demonstrando quantidade programada em coluna e Real (Presentes) em outra.

Mão de Obra Local (M.O), na coluna de CONTRATADA, com separações para Subcontratadas e Contratadas direta.

Campo de Turno, informando DIURNO E NOTURNO

Quadro de equipamentos informando a quantidade programada e Real (Utilizado no dia da obra).

Quantidade de efetivo											Equipamentos		
Item	Função	MOD		MOI		M.O.	CONTRATADA		TURNO		Descrição	Progr	Real
		Progr	Real	Progr	Real	Local	SB	DR	DIU	NOT			
		1	ANALISTA SST		2				2	2			
2	ENCARREGADO FLORESTAL II		2				2		2	0	Caminhonete 4x4		1
3	GERENTE FLORESTAL		1				1	2	3	0	Caminhonete 4x4		1
4	SUPERVISOR DE PROJETOS		1				1	2	3	0	Caminhonete 4x4		2
5	TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO		2				2	2	4	0	Caminhonete 4x4		1
6	TRABALHADOR BRACAL RURAL I		1				1	8	9	0	Caminhonete 4x4		1
7	TRABALHADOR BRACAL RURAL II		7					7	7	0	Caminhonete 4x4		2
8											Motocoveador		3
9											Motocoveador		2
TOTAL		0	16	0	0	0	9	23	32	0	TOTAL	0	16

MÃO DE OBRA



Opção 14:

Quadro de efetivos com o nome da Empresa no topo superior.

2 colunas contendo o nome do cargo com M (Efetivos Mobilizados), C (Efetivos presentes), F (Faltas), T (Total de efetivos presentes) e E (Quantidade de pessoas realizando hora extra), coluna para identificar (MOD/MOI).

Total de todos os cálculos e somatórias realizadas, conforme coluna mandante.

EFETIVO - QUADRO DETALHADO

Legenda: C - Cadastrados F - Faltas T - Total E - Quantidade de pessoas em hora extra

EMPRESA S.A

-								-							
Cargo								Cargo							
	M	C	F	T	E	MOI/MOD		M	C	F	T	E	MOI/MOD		
01	Ajudante	1	1		1		MOD	02	Ajudante de Almoxarifado	1	1		1		MOD
03	Almoxarife	2	2		2		MOI	04	Analista de Custo	2	2		2		MOI
05	Analista de Engenharia	1	1		1		MOI	06	Analista de Planejamento	3	3		3		MOI
07	Analista de Projetos	2	2		2		MOI	08	Apontador	2	2		2		MOI
09	Apropriador	2	2		2		MOI	10	Armador	1	1		1		MOD
11	Assistente Administrativo	3	3		3		MOD	12	Assistente Administrativo.	0	4		4		MOI
13	Assistente de Almoxarifado	0	1		1		MOI	14	Assistente de Compras	0	5		5		MOI
15	Assistente de Recursos Humanos	0	1		1		MOI	16	Aux. de Topografia	0	2		2		MOI
17	Auxiliar Administrativo	0	1		1		MOI								
-	Total	20	34	0	34	0	-								

MÃO DE OBRA



Opção 15:

Quadro de efetivos nominais, com o nome da empresa pertencente na esquerda do nome.

Campos Cargo, Matricula, Falta e Ates. (Atestado), HN (Quantidade de Horas Normais trabalhadas), HE (Horas Extras executadas) e Entrada/Saída do colaborador.

Cálculos realizados de forma automático.

EFETIVO NOMINAL

Empresa	Nome	Tipo	Cargo	Matricula	Falta	Ates	HN	HE	Entrada	Saída
EMPRESA S.A	Abner	MOD	Servente	16467			10,00	0,00	7,00	17,00
EMPRESA S.A	Bruno	MOD	Auxiliar de Sondador	13485			10,00	0,00	7,00	17,00
EMPRESA S.A	Carlos	MOI	Motorista de Caminhão - A	15981			10,00	0,00	7,00	17,00
EMPRESA S.A	Daniel	MOD	Assistente Administrativo	16346			10,00	0,00	7,00	17,00
EMPRESA S.A	Eduardo	MOD	Encarregado de obras	12305			10,00	0,00	7,00	17,00
EMPRESA S.A	Fabio	MOD	Servente	16403			10,00	0,00	7,00	17,00
EMPRESA S.A	Gabriel	MOD	Servente	16411			10,00	0,00	7,00	17,00
EMPRESA S.A	Henrique	MOD	Comprador	14397			10,00	0,00	7,00	17,00
EMPRESA S.A	Igor	MOD	Topógrafo	28995			10,00	0,00	7,00	17,00

MÃO DE OBRA



Opção 16:

Quadro de efetivos DIRETO e indireto.

Quadro informando Previsão (Quantidade de Efetivo previsto para a obra), Presente, quantidade de efetivos atuando na obra. HN (Hora Normal) e HE (Hora Extra) somados diferencialmente em 2 colunas.

Acumulado. HN e Acumulado HE. Somando o total de HN do efetivo desde o primeiro lançamento do RDO até o dia do lançamento do mesmo.

EFETIVO DIRETO							Acumulado	
Função	Tipo	Mobilizado	Presente	Falta	HN	HE	Acum. HN	Acum. HE
Assistente Administrativo	MOD	1	1	0	10,00	0,00	37,00	0,00
Comprador	MOD	1	1	0	10,00	0,00	10,00	0,00
Servente	MOD	3	3	0	30,00	0,00	30,00	0,00
Topógrafo	MOD	1	1	0	10,00	0,00	10,00	0,00
Encarregado de obras	MOD	1	1	0	10,00	0,00	10,00	0,00
Auxiliar de Sondador	MOD	1	1	0	10,00	0,00	10,00	0,00
Ajudante	MOD	-	-	-	-	-	29,00	0,00
Ajudante de Almojarifado	MOD	-	-	-	-	-	49,00	0,00
Armador	MOD	-	-	-	-	-	9,00	0,00
Total	-	8	8	0	80,00	0,00	194,00	0,00
EFETIVO INDIRETO							Acumulado	
Função	Tipo	Mobilizado	Presente	Falta	HN	HE	Acum. HN	Acum. HE
Analista de Projetos	MOI	1	1	0	10,00	0,00	28,00	0,00
Lubrificador de Maquinas	MOI	1	1	0	10,00	0,00	20,00	0,00
Motorista de Caminhão - A	MOI	1	1	0	10,00	0,00	20,00	0,00
Encarregado de Recursos Humanos	MOI	1	1	0	10,00	0,00	20,00	0,00
Líder de Campo.	MOI	1	1	0	10,00	0,00	30,00	0,00
Comprador.	MOI	1	1	0	10,00	0,00	20,00	0,00
Almojarife	MOI	-	-	-	-	-	58,00	0,00
Total	-	6	6	0	60,00	0,00	196,00	0,00

MÃO DE OBRA



Opção 17:

Quadro de efetivos, com o nome da empresa pertencente na esquerda do nome.

Campos Função, Mobilizado, Presente, Falta; HN (Horas normais) e HE (Horas Extras)

Acumulado HN. e Acumulado HE. Somando o total de HN do efetivo desde o primeiro lançamento do RDO até o dia do lançamento do mesmo.

EFETIVO SUBCONTRATADA							Acumulado	
Empresa	Função	Mobilizado	Presente	Falta	HN	HE	HN	HE
SUBCON S.A	Assistente Administrativo	1	1	0	9,00	0,00	9,00	0,00
SUBCON S.A	Motorista de Caminhão - A	1	1	0	9,00	0,00	9,00	0,00
SUBCON S.A	Servente	3	1	0	9,00	0,00	9,00	0,00
SUBCON S.A	Auxiliar de Sondador	1	1	0	9,00	0,00	9,00	0,00
Total		6	4	0	36	0	36	0

MÃO DE OBRA



Opção 18:

Quadro de efetivos com o nome da Subcontratada no topo superior e o local de atuação ao lado direito.

2 colunas contendo o nome do cargo com M (Efetivos Mobilizados), F (Faltas), T (Total de efetivos presentes), A (Atestado) e coluna para identificar (MOD/MOI).

EFETIVO - QUADRO DETALHADO

Legenda: M - Mobilizado F - Faltas A - Atestado T - Total

Empresa: **EMPRESA S.A** - Local: **Frente A**

-	Cargo	M	F	A	T	MOI/MOD	-	Cargo	M	F	A	T	MOI/MOD
01	1/2 Oficial de Pedreiro	2			2	MOD	02	Acabador de Drywall	3			3	MOD
03	Ajudante Geral	4			4	MOD	04	Ajudante Operação	5			5	MOD
05	Ajudante de Almoarifado	1			1	MOD	06	Ajudante de Assentador	5			5	MOD
07	Almoxarife	4			4	MOI	08	Analista Administrativo	5			5	MOI
09	Analista Administrativo de Obras	6			6	MOI	10	Analista Administrativo e Financeiro	7			7	MOI
11	Analista RH de Obra	8			8	MOI							
-	Total	50	0	0	50	-							

MÃO DE OBRA



Opção 19:

Quadro de efetivos apenas das subcontratadas.

1 coluna contendo o nome do cargo com C (Efetivos presentes), F (Faltas), T (Total de efetivos presentes) e E (Quantidade de pessoas realizando hora extra), coluna para identificar (MOD/MOI) e a Empresa pertencente ao efetivo.

Explicação final, mostrando a quantidade de cargos, quantos MOD e MOI, quantidades de empresas distintas e quantidade total de efetivos.

QUADRO DE MÃO DE OBRA Legenda: T - Total presente E - Quantidade de pessoas em hora extra MOD - Mão de obra Direta MOI - Mão de obra Indireta

EMPRESA S.A

FUNÇÃO		T	E	MOD/MOI	FUNÇÃO		T	E	MOD/MOI
01	1/2 Oficial de Pedreiro	1		MOD	02	Acabador de Drywall	2		MOD
03	Ajudante Geral	2		MOD	04	Ajudante Operação	4		MOD
05	Ajudante de Almoarifado	1		MOD	06	Almoarifado	2		MOI
07	Analista Administrativo	3		MOI	08	Analista Administrativo de Obras	4		MOI
09	Analista Administrativo e Financeiro	1		MOI					
9 FUNÇÕES		10 MOD			10 MOI			GERAL:20	

MÃO DE OBRA



Opção 20:

Quadro de efetivo por nome da empresa no título principal, separado em EFETIVOS MOI e MOD.

Cada cargo em linha única, seguido da quantidade total de efetivos daquele cargo.

Somatória total da quantidade de cargos (MOD ou MOI), na última linha de cada mão de obra.

EFETIVO MOI - EMPRESA S.A

Item	Cargo	Quantidade
01	Almoxarife	1
02	Analista de Custo	1
03	Analista de Engenharia	2
04	Analista de Planejamento	2
05	Analista de Projetos	4
06	Apontador	5
07	Apropriador	2
08	Assistente Administrativo.	1
09	Assistente de Almoxarifado	1
10	Assistente de Compras	2
11	Assistente de Recursos Humanos	1
12	Aux. de Topografia	1
13	Auxiliar Administrativo	2
14	Auxiliar Tecnico	2
-	TOTAL INDIRETO	27

EFETIVO MOD - EMPRESA S.A

Item	Cargo	Quantidade
01	Ajudante	1
02	Ajudante de Almoxarifado	2
03	Armador	6
04	Assistente Administrativo	2
-	TOTAL DIRETO	11

MÃO DE OBRA



Opção 21:

Quadro de efetivo por tipo de Mão de Obra.

Quadro informando a função, a empresa pertencente, e a quantidade por turno de trabalho.

Somatória informando o subtotal por contratada e subcontratada e TOTAL.

QUADRO DE EFETIVO - MOD

Legenda: MOI - Mão de obra indireta | MOD - Direta

ITEM	FUNÇÃO	EMPRESA	TIPO	1º TURNO	2º TURNO	3º TURNO
1	Ajudante	EMPRESA S.A	MOD	1	1	1
2	Ajudante de Almoarifado	EMPRESA S.A	MOD	2	2	2
3	Armador	EMPRESA S.A	MOD	2	2	
4	Assistente Administrativo	EMPRESA S.A	MOD	1	2	
5	Auxiliar Técnico de Engenharia	EMPRESA S.A	MOD	2	1	1
6	Auxiliar de Sondador	EMPRESA S.A	MOD		2	2
7	Auxiliar de Topografia	EMPRESA S.A	MOD			1
Subtotal Contratada - MOD				8	10	7
Subtotal Subcontratada - MOD				0	0	0
TOTAL - MOD				8	10	7

MÃO DE OBRA



Opção 22:

Quadro de efetivo por Nomes.

Quadro informando o nome, o tipo, cargo, matricula, faltas e atestados, HN e HE, Entrada e saída.

EFETIVO NOMINAL

Nome	Tipo	Cargo	Matricula	Falta	Ates	HN	HE	Entrada	Saída
Luana Albuquerque	MOD	Auxiliar de Operação	78963			00:00	00:00		
Bruna neunenhuas	MOI	Coordenador Administrativo & Financeiro	1574			00:00	00:00		
Junior Costa	MOI	Arquiteto	16467			00:00	00:00		
Murillo Pereira	MOI	Analista Administrativo e Financeiro	5487			00:00	00:00		
Thiago Silva	MOI	Analista de Contratos	5784			00:00	00:00		

MÃO DE OBRA



Opção 23:

Quadro de efetivo detalhado por Equipes e Nomes.

Quadro informando a equipe, o tipo, função, matrícula, nome, mobilizados, presente, falta e afastamento ou férias.

EFETIVO DETALHADO									
M: Mobilizado / P: Presente / F: Falta / A: Afastamento ou Férias									
Item	Equipe	Tipo MO	Função	Matrícula	Nome	M	P	F	AF
1	Perfuração					5	5	0	0
		MOD				5	5	0	0
			1/2 Oficial de Pedreiro			1	1	0	0
				11234	João da Silva		X		
			Acabador de Drywall			1	1	0	0
				11237	Carla Soares		X		
			Ajudante Geral			1	1	0	0
				11236	Fernando Oliveira		X		
			Ajudante Operação			1	1	0	0
				11235	Mauricio Gomes		X		
			Ajudante de Eletricista			1	1	0	0
				11238	Miguel Cruz		X		

MÃO DE OBRA



Opção 24:

Quadro de efetivo detalhado por Empresas e Nomes.

Quadro informando a empresa, o nome, tipo, cargo, matricula, faltas e atestados, HN, HE e entrada e saída.

EFETIVO NOMINAL

Empresa	Nome	Tipo	Cargo	Matricula	Falta	Ates	HN	HE	Entrada	Saída
EMPRESA S.A	Carla Soares	MOD	Acabador de Drywall	11237			10,00	3,00	7,00	17,00
EMPRESA S.A	Fernando Oliveira	MOD	Ajudante Geral	11236			10,00	2,00	7,00	17,00
EMPRESA S.A	João da Silva	MOD	1/2 Oficial de Pedreiro	11234			10,00	2,00	7,00	17,00
EMPRESA S.A	Mauricio Gomes	MOD	Ajudante Operação	11235			10,00	3,00	7,00	17,00
EMPRESA S.A	Miguel Cruz	MOD	Ajudante de Eletricista	11238			10,00	2,00	7,00	17,00

MÃO DE OBRA



Opção 25:

Quadro de efetivo detalhado por Áreas e Nomes.

Quadro informando a área, o nome, tipo, cargo, matrícula, faltas e atestados, HN, HE e entrada e saída.

EFETIVO NOMINAL

Área	Nome	Tipo	Cargo	Matricula	FaltaAtes	HN	HE	Entrada	Saída
Administração Contratual	Fernando Oliveira	MOD	Ajudante Geral	11236		9,00	0,00	7,00	17,00
Administração Contratual	Carla Soares	MOD	Acabador de Drywall	11237		9,00	0,00	7,00	17,00
Analista de planejamento	Mauricio Gomes	MOD	Ajudante Operação	11235		9,00	0,00	7,00	17,00
Analista de planejamento	João da Silva	MOD	1/2 Oficial de Pedreiro	11234		9,00	0,00	7,00	17,00
Engenharia	Miguel Cruz	MOD	Ajudante de Eletricista	11238		9,00	0,00	7,00	17,00

MÃO DE OBRA



Opção 26:

Quadro de efetivo detalhado por Empresas e Ordem de serviço.

Quadro informando o cargo, cadastrados, faltas, total e quantidade de pessoas em hora Extra.

Distingue quais são MOI e MOD.

EFETIVO - QUADRO DETALHADO Legenda: C - Cadastrado F - Faltas T - Total E - Quantidade pessoas em hora extra

Empresa: **EMPRESA S.A** - Frente: **O.S**

-	Cargo	C	F	T	E	MOI/MOD	-	Cargo	C	F	T	E	MOI/MOD
01	1/2 Oficial de Pedreiro	0		1		MOD	02	Acabador de Drywall	0		2		MOD
03	Ajudante Geral	0		3		MOD	04	Ajudante Operação	0		1		MOD
05	Ajudante de Almoxarifado	0		2		MOD	06	Ajudante de Assentador	0		1		MOD
07	Ajudante de Eletricista	0		2		MOD	08	Ajudante de Estruturas Metálicas	0		3		MOD
09	Ajudante de Impermeabilização	0		1		MOD							
-	Total	0	0	16	0	-							

MÃO DE OBRA



Opção 27:

Quadro de efetivo detalhado por Ordem de serviço.

Quadro informando a função, tipo (MOD e MOI), mobilizados, presente, falta, HN (Horas normais), HE (Horas extras) e o Acumulado das respectivas horas.

EFETIVO DIRETO

Ordem de Serviço: O.S

Acumulado

Função	Tipo	Mobilizado	Presente	Falta	HN	HE	Acum. HN	Acum. HE
1/2 Oficial de Pedreiro	MOD	0	1		10,00	0,00	10,00	0,00
Acabador de Drywall	MOD	0	2		20,00	0,00	20,00	0,00
Ajudante Geral	MOD	0	3		30,00	0,00	30,00	0,00
Ajudante Operação	MOD	0	1		10,00	0,00	10,00	0,00
Ajudante de Almojarifado	MOD	0	2		20,00	0,00	20,00	0,00
Total	-	0	9	0	90,00	0,00	90,00	0,00

EFETIVO INDIRETO

Ordem de Serviço: O.S

Acumulado

Função	Tipo	Mobilizado	Presente	Falta	HN	HE	Acum. HN	Acum. HE
Almojarife	MOI	0	2		20,00	0,00	20,00	0,00
Analista Administrativo	MOI	0	2		20,00	0,00	20,00	0,00
Analista Administrativo de Obras	MOI	0	1		10,00	0,00	10,00	0,00
Analista Administrativo e Financeiro	MOI	0	1		10,00	0,00	10,00	0,00
Analista RH de Obra	MOI	0	3		30,00	0,00	30,00	0,00
Analista de Apoio Técnico	MOI	0	2		20,00	0,00	20,00	0,00
Analista de Compras	MOI	0	1		10,00	0,00	10,00	0,00
Total	-	0	12	0	120,00	0,00	120,00	0,00

MÃO DE OBRA



Opção 28:

Quadro de efetivo detalhado da empresa padrão.

Quadro dividido por MOD e MOI, exibindo a função, subtotal e o total.

EMPRESA S.A					
Legenda: MOD - Mão de obra Direta MOI - Mão de obra Indireta					
Função - MOD	Total	Presente	Função - MOI	Total	Presente
1/2 Oficial de Pedreiro	1	1	Almoxarife	2	2
Acabador de Drywall	2	2	Analista Administrativo	2	2
Ajudante Geral	3	3	Analista Administrativo de Obras	1	1
Ajudante Operação	1	1	Analista Administrativo e Financeiro	1	1
Ajudante de Almoxarifado	2	2	Analista RH de Obra	3	3
			Analista de Apoio Técnico	2	2
			Analista de Compras	1	1
Subtotal MOD	9	9	Subtotal MOI	12	12
			TOTAL	21	21

MÃO DE OBRA



Opção 29:

Quadro de efetivo detalhado e equipamentos, separado por área, da empresa padrão.

Quadro informando a função, empresa, tipo, previsto e real do Efetivo. Nos equipamentos exibe a descrição, previsto e real.

Somatória total dos efetivos e dos equipamentos.

Quantidade de efetivo					Equipamentos			
Administração Contratual								
Item	Função	Empresa	Tipo	Previsto	Real	Descrição	Previsto	Real
0	1/2 Oficial de Pedreiro	EMPRESA S.A	MOD		2	AUTO-BETONEIRA -	0	2
1	Acabador de Drywall	EMPRESA S.A	MOD		1	Aspirador Água e Pó -	0	1
2	Ajudante Geral	EMPRESA S.A	MOD		1	BOMBA DE SUCÇÃO -	0	1
3	Ajudante Operação	EMPRESA S.A	MOD		2	BOMBA D'AGUA -	0	2
4	Ajudante de Almoarifado	EMPRESA S.A	MOD		2	BOMBA SUBMERSA -	0	1
5	Ajudante de Assentador	EMPRESA S.A	MOD		1			
TOTAL ÁREA				0	9	TOTAL ÁREA	0	7
TOTAL GERAL				0	9	TOTAL GERAL	0	7

MÃO DE OBRA



Opção 30:

Quadro de efetivo subcontratada detalhado e equipamentos.

Quadro informando a função, tipo de mão de obra (MOI e MOD), previsto e previsto. Nos equipamentos exibe a descrição, total e presente.

Somatória total dos efetivos e dos equipamentos.

Subcontratadas

Item	Função / Empresa	MOD		MOI		Descrição	Total	Presente
		Total	Presente	Total	Presente			
1	Ajudante	2	2			CARRO POPULAR COM AR	1	1
2	Almoxarife	1	1			FURADEIRA MANUAL	2	2
3	Eletricista	2	2			LIXADEIRA MANUAL	1	1
4	Auxiliar Administrativo			2	2	MÁQUINA DE SOLDA	2	2
5	Coordenador de Obra			3	3	ONIBUS PARA TRANSPORTE PESSOAL	1	1
6	Desenhista Cadista			1	1	ROSQUEADEIRA RIDIGID	1	1
7	Desenhista Projetista			1	1			
TOTAL		5	5	7	7	TOTAL	8	8

MÃO DE OBRA



Opção 31:

Quadro de efetivo separado por até 5 Turnos.

Quadro separado por MOD e MOI, informando a função, empresa e a quantidade presente por turno.

Somatória total da contratada e subcontratada.

QUADRO DE EFETIVO - MOD

Legenda: MOI - Mão de obra indireta | MOD - Direta

ITEM	FUNÇÃO	EMPRESA	ADM	1º TURNO	2º TURNO	3º TURNO	4º TURNO
1	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Consórcio	1	1	1	1	2
2	AJUDANTE DE MONTAGEM	Consórcio	1	2	2	2	1
3	AJUDANTE DE PRODUÇÃO	Consórcio	2		1	1	2
Subtotal Contratada - MOD			4	3	4	4	5
Subtotal Subcontratada - MOD			0	0	0	0	0
TOTAL - MOD			4	3	4	4	5

QUADRO DE EFETIVO - MOI

Legenda: MOI - Mão de obra indireta | MOD - Direta

ITEM	FUNÇÃO	EMPRESA	ADM	1º TURNO	2º TURNO	3º TURNO	4º TURNO
1	ADMINISTRADOR DE OBRA II LOCAL	Consórcio	2	1	3	2	1
2	ADMINISTRADOR DE OBRA III	Consórcio	2	2	1	2	2
3	AJUDANTE DE LUBRIFICACAO	Consórcio	1	1	1	1	2
4	ANALISTA ADM CONTRATUAL E RISCOS II	Consórcio	1				2
Subtotal Contratada - MOI			6	4	5	5	7
Subtotal Subcontratada - MOI			0	0	0	0	0
TOTAL - MOI			6	4	5	5	7

MÃO DE OBRA



Opção 32:

Quadro de efetivos com o nome da Subcontratada no topo superior e o local de atuação ao lado direito.

2 colunas contendo o nome do cargo com M (Efetivos Mobilizados), F (Faltas), A (Atestado), T (Total de efetivos presentes), e coluna para identificar (MOD/MOI).

Somatória Total dos efetivos.

Empresa subcontratada: **SUBCON S.A** - Local: **Frente A**

-	Cargo	M	F	A	T	MOI/MOD	-	Cargo	M	F	A	T	MOI/MOD
01	1/2 Oficial de Pedreiro	0			2	MOD	02	Acabador de Drywall	0			2	MOD
03	Ajudante Geral	0			1	MOD	04	Ajudante Operação	0			3	MOD
05	Almoxarife	0			3	MOI	06	Analista Administrativo	0			1	MOI
07	Analista Administrativo de Obras	0			2	MOI	08	Analista Administrativo e Financeiro	0			1	MOI
							-	Total	0	0	0	15	-

MÃO DE OBRA



Opção 33:

Quadro de efetivos Subcontratada

Apresentando a Função, Total, Pessoas em hora extra, MOD & MOI e a empresa que ele pertence.

Somatória Total de cada coluna e GERAL.

QUADRO DE MÃO DE OBRA TERCEIROS

Legenda: T - Total presente E - Quantidade de pessoas em hora extra MOD - Mão de obra Direta MOI - Mão de obra Indireta

-	FUNÇÃO	T	E	MOI/MOD	EMPRESA	
01	1/2 Oficial de Pedreiro	2		MOD	SUBCON S.A	
02	Acabador de Drywall	2		MOD	SUBCON S.A	
03	Ajudante Geral	1		MOD	SUBCON S.A	
04	Ajudante Operação	1		MOD	SUBCON S.A	
05	Almoxarife	2		MOI	SUBCON S.A	
06	Analista Administrativo	1		MOI	SUBCON S.A	
07	Analista Administrativo de Obras	2		MOI	SUBCON S.A	
08	Analista Administrativo e Financeiro	3		MOI	SUBCON S.A	
8 FUNÇÕES		6 MOD		8 MOI	1 EMPRESA(s)	GERAL:14

MÃO DE OBRA



Opção 34:

Quadro de efetivos Subcontratada por empresa

Apresentando a Cargo, Cadastrados, Faltas, Total, Pessoas em hora extra, MOD & MOI.

Somatória Total de cada coluna.

SUBCON S.A

-							-						
Cargo							Cargo						
	C	F	T	E	MOI/MOD		C	F	T	E	MOI/MOD		
01	Ajudante Geral	2		2		MOD	02	Ajudante de Almoxarifado	2		2		MOI
03	Ajudante de Eletricista	1		1		MOD	04	Ajudante de Montagem	1		1		MOD
05	Analista Administrativo e Financei	3		3		MOI	06	Analista RH de Obra	2		2		MOI
07	Analista de Apoio Técnico	2		2		MOI	08	Analista de Compras	1		1		MOI
							-	Total	14	0	14	0	-

MÃO DE OBRA



Opção 35:

Quadro de efetivos detalhado.

Apresentando a Cargo, Cadastrados, Faltas, Atestados, Total, MOD & MOI.

Somatória Total de cada coluna.

EFETIVO - QUADRO DETALHADO

Legenda: C - Cadastrados F - Faltas A - Atestado T - Total

EMPRESA S.A

-	Cargo	C	F	A	T	MOI/MOD	-	Cargo	C	F	A	T	MOI/MOD
01	Ajudante Geral	2			2	MOD	02	Ajudante de Eletricista	2			2	MOD
03	Ajudante de Estruturas Metálicas	3			3	MOD	04	Ajudante de Montagem	3			3	MOD
05	Ajudante de Obras	2			2	MOD	06	Almoxarife	3			3	MOI
07	Analista Administrativo de Obras	3			3	MOI	08	Analista Administrativo e Financeiro	2			2	MOI
09	Analista de Apoio Técnico	2			2	MOI	10	Analista de Compras	1			1	MOI
							-	Total	23	0	0	23	-

MÃO DE OBRA



Opção 36:

Quadro de efetivos detalhado Subcontratada.

Apresentando a Cargo, Cadastrados, Faltas, Atestados, Total, MOD & MOI.

Somatória Total de cada coluna.

SUBCON S.A

-	Cargo	C	F	A	T	MOI/MOD	-	Cargo	C	F	A	T	MOI/MOD
01	Ajudante Geral	2			2	MOD	02	Ajudante de Eletricista	2			2	MOD
03	Ajudante de Estruturas Metálicas	1			1	MOD	04	Ajudante de Montagem	3			3	MOD
05	Ajudante de Obras	1			1	MOD	06	Ajudante de Soldador	2			2	MOD
07	Almoxarife	1			1	MOI	08	Analista Administrativo de Obras	2			2	MOI
09	Analista Administrativo e Financei	3			3	MOI	10	Analista RH de Obra	1			1	MOI
11	Analista de Apoio Técnico	2			2	MOI	12	Analista de Compras	1			1	MOI
							-	Total	21	0	0	21	-

MÃO DE OBRA



Opção 37:

Quadro de efetivos detalhado
Subcontratada.

Apresentando a empresa, mobilizado,
presente, falta, HN, HE e acumulado

Somatória Total de cada coluna.

EFETIVO SUBCONTRATADA						Acumulado	
Empresa	Mobilizado	Presente	Falta	HN	HE	HN	HE
SUBCONTRATADA	0	27		270,00	0,00	270,00	0,00
SUBCON S.A	0	14		140,00	0,00	140,00	0,00
-						-	-
Total	0	8	0	410,00	0,00	410,00	0,00

MÃO DE OBRA



Opção 38:

Quadro de efetivos detalhado
Subcontratada MOD e MOI.

Apresentando a empresa, mobilizado,
presente, falta, HN, HE e acumulado

Somatória Total de cada coluna.

EFETIVO DIRETO - SUBCONTRATADAS

Área: O.S

Acumulado

Função	Tipo	Presente	Falta	HN	HE	Acum. HN	Acum. HE
1/2 Oficial de Pedreiro	MOD	4		40,00	0,00	40,00	0,00
Acabador de Drywall	MOD	1		10,00	0,00	10,00	0,00
Ajudante Operação	MOD	2		20,00	0,00	20,00	0,00
Ajudante de Eletricista	MOD	4		40,00	0,00	40,00	0,00

EFETIVO INDIRETO - SUBCONTRATADAS

Área: O.S

Acumulado

Função	Tipo	Presente	Falta	HN	HE	Acum. HN	Acum. HE
Almoxarife	MOI	3		30,00	0,00	30,00	0,00
Analista Administrativo	MOI	3		30,00	0,00	30,00	0,00
Analista Administrativo e Financeiro	MOI	3		30,00	0,00	30,00	0,00
Analista RH de Obra	MOI	3		30,00	0,00	30,00	0,00

MÃO DE OBRA



Opção 39

Quadro de efetivo por tipo de Mão de Obra.

Quadro informando separadamente a empresa pertencente.

Exibe a quantidade informando),
A (Atestado),
F (Faltas),
T(Total de efetivos presentes e
E (Quantidade de pessoas realizando hora
extra),
coluna para identificar (MOD/MOI).

EFETIVO - QUADRO DETALHADO													
EMPRESA S.A													
Legenda: C - Cadastrados F - Faltas T - Total E - Quantidade de pessoas em hora extra													
Cargo	A	F	T	E	MOI/MOD	Cargo	A	F	T	E	MOI/MOD		
01	ELETRICISTA	7	0	1		MOD	02	SUP. ELETRICA	1	0	1		MOI
03	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	1	0	1		MOI	04	MONTADOR ANDAIMES	1	0	1		MOD
05	GERENTE DE QUALIDADE	1	0	1		MOI	06	TÉCNICO DE RIGGER	2	0	1		MOI
07	ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	1	0	1		MOI							
-	Total	14	0	7	0	-							



Seção de Equipamentos



Esse canal registra de formas diferentes as informações, quantidade e quais equipamentos foram utilizados no diário, sendo eles as quantidades reais, previstas ,acumuladas..

EQUIPAMENTOS



Opção 01:

Quadro de equipamentos de cada empresa em único quadro.

Equipamentos informando a quantidade utilizada por período (Diurno, Noturno) e a quantidade prevista de uso.

Linha informando a quantidade subtotal da contratada e subcontratada, e a soma de ambas retornando o total.

QUADRO DE EQUIPAMENTOS

ITEM	EQUIPAMENTO	EMPRESA	DIURNO	NOTURNO	PREVISTO
1	AMBULANCIA	EMPRESA S.A	1	2	
2	AMBULANCIA 02	EMPRESA S.A	1	2	
3	CAMINHÃO BASCULANTE 01	EMPRESA S.A	2	1	
4	CAMINHÃO BASCULANTE 16M³	EMPRESA S.A	2	1	
Subtotal Contratada			6	6	0
Subtotal Subcontratada			0	0	0
TOTAL			6	6	0

EQUIPAMENTOS



Opção 02:

Quadro de equipamentos e ferramental.

Equipamentos e Ferramental informando a quantidade Real (Total) utilizada

Linha informando a quantidade total de equipamentos e ferramental utilizados.

EQUIPAMENTOS					Legenda: Prev - Previsto
Item	Ferramental	Real	Item	Equipamentos	Real
01			01	AMBULANCIA	1
02			02	AMBULANCIA 02	2
03			03	CAMINHÃO BASCULANTE 01	2
04			04	CAMINHÃO BASCULANTE 16M³	1
05			05	CAMINHÃO BETONEIRA 6X4R 8M3	2
06			06	CAMINHÃO CABINADO	2
07			07	ESCAVADEIRA HIDRAULICA 210P	2
08			08	GERADOR 5,5 KVA	2
Total ferramental		0	Total equipamentos		14

EQUIPAMENTOS



Opção 03:

Quadro de equipamentos de cada empresa em único quadro.

Equipamentos informando a TAG (Identif.), Fabricante do equip. , Quantidade utilizada, e empresa

Linha informando a quantidade total de equipamentos e a quantidade total de empresas distintas.

EQUIPAMENTOS APROPRIADOS

Ref.	Descrição	Tag	Fabricante	Qtd.	Empresa
01	CAMINHÃO BASCULANTE 16M³	EQ01	MERCEDEZ BENZ	1	EMPRESA S.A
02	CAMINHÃO BETONEIRA 6X4R 8M3	EQ02	MERCEDEZ BENZ	2	EMPRESA S.A
03	CAMINHÃO COM GUINDASTE 30 TON	EQ03	MERCEDEZ BENZ	2	EMPRESA S.A
04	CAMINHÃO TANQUE	EQ04	MERCEDEZ BENZ	1	EMPRESA S.A
05	CAMINHÃO TANQUE ABAST 15000 L	EQ05	MERCEDEZ BENZ	2	EMPRESA S.A
06	ESCAVADEIRA CASE CX220	EQ06	CATERPILLAR	2	EMPRESA S.A
07	ESCAVADEIRA CAT 320 COM ROMPEDOR	EQ07	CATERPILLAR	1	EMPRESA S.A
08	ESCAVADEIRA CAT 320 DL LONG REACH	EQ08	CATERPILLAR	2	EMPRESA S.A
09	ESCAVADEIRA CATERPILLAR 320DL LONG REACH	EQ09	CATERPILLAR	1	EMPRESA S.A
-			Total	14	1 empresa

EQUIPAMENTOS



Opção 04:

Quadro de equipamentos por Empresa e Subcontratados

Quadro informando a categoria, a empresa pertencente, Ausentes e a quantidade por turno de trabalho.

Somatória informando o subtotal por contratada e subcontratada e TOTAL.

Equipamentos (Próprio)					Equipamentos (Sub-Contratados)					
Categoria	Período		Ausentes	Total	Categoria	Empresa	Período		Ausentes	Total
	Diurno	Noturno					D	N		
CARRETA MUNCK	1	2	0	3	CARRETA MUNCK	WEBDUTOS	1	0	0	1
CARRETA SEMI-REBOQUE - 25 TON	1	2	0	3	CARRETA SEMI-REBOQUE - 25 TON	WEBDUTOS	2	0	0	2
Caminhão Munck 10 TON	2	1	0	3	Caminhão Munck 10 TON	WEBDUTOS	2	0	0	2
GUINDASTE TELESCÓPICO 220 TON	2	2	0	4	GUINDASTE TELESCÓPICO 220 TON	WEBDUTOS	2	0	0	2
GUINDASTES TELESCÓPICO - 160 TON	1	1	0	2	GUINDASTES TELESCÓPICO - 160 TON	WEBDUTOS	1	0	0	1
					GUINDASTES TELESCÓPICO - 50 / 70 TON	WEBDUTOS	2	0	0	2
TOTAL	17	8	0	25	TOTAL		0	0	0	0

EQUIPAMENTOS



Opção 05:

Quadro de equipamentos por Local.

Quadro informando a Descrição, o Local de atuação, Situação (Disponível e Em Atividade), Previsto a ser utilizado e a quantidade utilizada na obra.

Informativo a qual empresa o equipamento no diário, é pertencente.

EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS

-	Descrição	Situação	Quantidade	Empresa
01	AMBULANCIA - SJU1174	Disponível	1	EMPRESA S.A
02	AMBULANCIA 02	Em atividade	2	EMPRESA S.A
03	CAMINHÃO BASCULANTE 01 - CB-01	Disponível	1	EMPRESA S.A
04	CAMINHÃO BASCULANTE 16M³ - EQ01	Em atividade	2	EMPRESA S.A
05	CAMINHÃO BETONEIRA 6X4R 8M3 - EQ02	Em atividade	2	EMPRESA S.A
06	CAMINHÃO CABINADO - CABT-02	Em atividade	1	EMPRESA S.A
07	CAMINHÃO CABINADO - CABT-03	Em atividade	1	EMPRESA S.A
-	Total: 2 equipamentos disponíveis 5 em atividade		10	1 empresa

EQUIPAMENTOS



Opção 06:

Quadro de equipamentos por Empresa.

Quadro informando o Equipamento utilizado, a empresa pertencente a ele.

E Informativos no quadrado ao lado informando a unidade de medida, a quantidade utilizada, Acumulado anteriormente (refere-se ao dia anterior) e Acumulado (quantidade de vezes do equipamento utilizado até hoje).

EQUIPAMENTOS					
Empresa	Equipamento	UN	Quant	Acum.Ant.	Acumulado
EMPRESA S.A	CAMINHÃO BASCULANTE 16M³	Un	2,00	6,00	8,00
EMPRESA S.A	CAMINHÃO BETONEIRA 6X4R 8M3	Un	1,00	9,00	10,00
EMPRESA S.A	CAMINHÃO COM GUINDASTE 30 TON	Un	1,00	0,00	1,00
EMPRESA S.A	CAMINHÃO TANQUE	Un	2,00	0,00	2,00
EMPRESA S.A	ESCAVADEIRA CASE CX220	Un	2,00	0,00	2,00
EMPRESA S.A	ESCAVADEIRA CAT 320 COM ROMPEDOR	Un	1,00	0,00	1,00
EMPRESA S.A	ESCAVADEIRA CATERPILLAR 320DL LONG REACH	Un	1,00	0,00	1,00
Total			10	15	25

EQUIPAMENTOS



Opção 07:

Quadro de equipamentos por Empresa e informando Horímetro

Quadro informando o Equipamento utilizado, Horímetro, Acumulado, situação (Em atividade e Disponível), Quantidade e a Empresa pertencente a ele.

Informativo da quantidade total de equipamento disponível e quantos estão em atividade, total de equipamentos utilizados e a quantidade de empresas distintas.

EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS

-	Descrição	Horímetro	Acum.	Situação	Quant	Empresa
01	CAMINHÃO BASCULANTE 16M³ - EQ01	0,00 a 0,00	0,00	Em atividade	2	EMPRESA S.A
02	CAMINHÃO BETONEIRA 6X4R 8M3 - EQ02	0,00 a 0,00	0,00	Em atividade	1	EMPRESA S.A
03	CAMINHÃO COM GUINDASTE 30 TON - EQ03	0,00 a 0,00	0,00	Em atividade	1	EMPRESA S.A
04	CAMINHÃO TANQUE - EQ04	0,00 a 0,00	0,00	Em atividade	2	EMPRESA S.A
05	ESCAVADEIRA CASE CX220 - EQ06	0,00 a 0,00	0,00	Em atividade	2	EMPRESA S.A
06	ESCAVADEIRA CAT 320 COM ROMPEDOR - EQ07	0,00 a 0,00	0,00	Em atividade	1	EMPRESA S.A
07	ESCAVADEIRA CATERPILLAR 320DL LONG REACH - EQ09	0,00 a 0,00	0,00	Em atividade	1	EMPRESA S.A
-	Total: 0 equipamentos disponíveis 7 em atividade				10	1 empresa

EQUIPAMENTOS



Opção 08:

Quadro de equipamentos por Empresa e informando o Turno.

Quadro informando o Equipamento utilizado, Empresa e a Quantidade utilizada por Período.

Informativo da quantidade total de equipamento em cada turno.

QUADRO DE EQUIPAMENTOS

ITEM	EQUIPAMENTO	EMPRESA	1º TURNO	2º TURNO	3º TURNO
1	AMBULANCIA	EMPRESA S.A 1	1	2	4
2	AMBULANCIA 02	EMPRESA S.A 1	2	1	3
3	CAMINHÃO BASCULANTE 01	EMPRESA S.A 1	3	4	2
4	CAMINHÃO BASCULANTE 16M³	EMPRESA S.A 1	4	3	1
TOTAL			10	10	10

EQUIPAMENTOS



Opção 09:

Quadro de equipamentos totais informando o nome do equipamento, a quantidade e o previsto (Quantidades previstas de uso de equip.)

Informativo da quantidade total de equipamento e a somatória total de horas paradas a todos equipamentos.

EQUIPAMENTOS	
Descrição	Quantidade
AMBULANCIA	1
AMBULANCIA 02	2
CAMINHÃO BASCULANTE 01	3
CAMINHÃO BASCULANTE 16M³	4
CAMINHÃO BETONEIRA 6X4R 8M3	1
TOTAL EQUIPAMENTOS	11

EQUIPAMENTOS



Opção 10:

Quadro de equipamentos mobilizados, informando a descrição do equipamento, Local, Situação (em Atividade/Disponível), quantidade e empresas a que pertencem.

Informativo da quantidade total de equipamentos disponíveis, em atividade, total acumulado do dia e das empresas.

EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS

-	Descrição	Local	Situação	Quantidade	Empresa
01	ASPIRADOR ÁGUA E PÓ	Canteiro A	Disponível	1	EMPRESA S.A
02	ASPIRADOR ÁGUA E PÓ	Canteiro A	Em atividade	2	EMPRESA S.A
03	BOMBA DE SUCÇÃO	Canteiro A	Disponível	1	EMPRESA S.A
04	ASPIRADOR ÁGUA E PÓ	Canteiro A	Em atividade	2	SUBCON S.A
05	BOMBA D'ÁGUA	Canteiro A	Disponível	1	SUBCON S.A
06	BOMBA D'ÁGUA	Canteiro A	Em atividade	1	SUBCON S.A
07	BOMBA DE SUCÇÃO	Canteiro A	Em atividade	5	SUBCON S.A
08	BOMBA SUBMERSA	Canteiro A	Em atividade	1	SUBCON S.A
-	Total: 3 equipamentos disponíveis 11 em atividade			14	2 empresas

EQUIPAMENTOS



Opção 11:

Quadro de equipamentos mobilizados, informando a descrição do equipamento, área, TAG, quantidade e atividades que foram vinculadas.

Informativo da quantidade total de áreas, total acumulado do dia e das atividades.

EQUIPAMENTOS					
-	Descrição	Área	TAG	Quant.	Atividade
01	ASPIRADOR ÁGUA E PÓ	Planejamento	ASP-01	2	Topografia final para alinhamento e passagem da correia []
02	BOMBA D'ÁGUA	Planejamento	BDA-01	3	Topografia final para alinhamento e passagem da correia []
03	BOMBA DE SUCÇÃO	Planejamento	BSUC-07	2	Topografia final para alinhamento e passagem da correia []
04	BOMBA SUBMERSA	Planejamento	BSUB-04	1	Topografia final para alinhamento e passagem da correia []
05	CAMINHÃO COM GUINDASTE	Planejamento	CCG-05	2	Topografia final para alinhamento e passagem da correia []
06	CAMINHÃO TANQUE ABAST	Planejamento	CTA-02	1	Topografia final para alinhamento e passagem da correia []
		1 área	Total:	11	1 atividade

EQUIPAMENTOS



Opção 12:

Quadro de equipamentos, informando a TAG, descrição do equipamento, área e quantidade.

Informativo da quantidade total de áreas, total acumulado do dia.

EQUIPAMENTOS

-	TAG	Descrição	Área	Quant.
01	ASP-01	ASPIRADOR ÁGUA E PÓ	Planejamento	2
02	BDA-01	BOMBA D'ÁGUA	Planejamento	3
03	BSUC-07	BOMBA DE SUCÇÃO	Planejamento	2
04	BSUB-04	BOMBA SUBMERSA	Planejamento	1
05	CCG-05	CAMINHÃO COM GUINDASTE	Planejamento	2
06	CTA-02	CAMINHÃO TANQUE ABAST	Planejamento	1
			1 área	Total: 11

EQUIPAMENTOS



Opção 13:

Quadro de equipamentos dividido em duas colunas, informando a Descrição e quantidade Real.

Informativo da quantidade total.

QUADRO DE EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Real	Item	Descrição	Real
01	ASPIRADOR ÁGUA E PÓ	2	02	ASPIRADOR ÁGUA E PÓ	3
03	BOMBA D'ÁGUA	1	04	BOMBA D'ÁGUA	1
05	BOMBA DE SUCÇÃO	2	06	BOMBA DE SUCÇÃO	5
07	BOMBA SUBMERSA	3	08	BOMBA SUBMERSA	1
09	CAMINHÃO COM GUINDASTE	1	10	CAMINHÃO COM GUINDASTE	2
11	CAMINHÃO TANQUE ABAST	2		Total	23

EQUIPAMENTOS



Opção 14:

Quadro de equipamentos resumidos, dividido em duas colunas, equipamento direto e equipamento indireto.

informando a Descrição e quantidade mobilizada, prevista e real.

Informativo da quantidade total.

EQUIPAMENTOS RESUMIDOS											
EMPRESA S.A - Empresa											
Equipamento Direto - EQD					Equipamento Indireto - EQI						
Item	Mob.	Prev.	Real	Item	Mob.	Prev.	Real				
01			0	01			2				
02			0	02			3				
03			0	03			2				
04			0	04			4				
05			0	05			1				
06			0	06			1				
Total EQD			0	0	0	Total EQI			0	0	13

EQUIPAMENTOS



Opção 15:

Quadro de equipamentos detalhados por Equipes.

Informando a Equipe, Tipo, Equipamento, TAG, Marca, Mobilizado, Operando, A disposição e Manutenção.

EQUIPAMENTOS DETALHADOS									
M: Mobilizado / OP: Operando / AD: A disposição / M: Manutenção									
Item	Equipe	Tipo EQP	Equipamento	TAG	Marca/Modelo/Identificação	M	OP	AD	M
1	Equipe A					14	14	0	0
		EQD				14	14	0	0
		BARCO				6	0	6	0
				BAC-01			X		
				BAC-01A			X		
				BAC-02A			X		
		CAMINHÃO COMBOIO				2	0	2	0
				RUU4A91			X		
		CAMINHÃO MUNCK				3	0	3	0
				RKP8C19			X		
				RNF-5G62			X		
		CAMINHÃO PIPA				1	0	1	0
				RMK6A73			X		
		ESCAVADEIRA SPIDER				2	0	2	0
				SPD-01	SPIDER M220		X		

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

FRM RDO-MD versão 2
 Obra: PARADA G-200: PROJETO TIE-INS. Projeto: TIE-INS BAS505F Data: 29.05.2019

Valor original: R\$ - Valor aditivado: R\$ - RDO n.º: RDO.0020.TIE-INS BAS505F

Cliente: BASF Unidade: Guaratinguetá Gestor: -

Prazo: 35 dias Prazo decorrido: 20 dias Prazo restante: 15 dias Início: 10/05/2019 Término: 14/06/2019 Modalidade contratual: P.U. / H.H

Pluviosidade: 0 mm Condições da área: Operável Houve acidente?: Não Interrupção trabalho: Não Status: consolidado Contratada: SGS do Brasil Ltda.

ACIDENTE	EFETIVO	EQUIPAMENTOS
Com afastamento no dia	0	Indireta (MOI)
Com afastamento susbentos hoje	0	Direta (MOD)
Com afastamento acumulado obra	0	Subcontratados mobilizados
Sem afastamento no dia	0	Ausentes
Sem afastamento acumulado obra	0	Eletivo total

PARALIZAÇÕES

On	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Total
														X	X										2h


ATIVIDADES REALIZADAS

ID	Ident	Descrição	UN	QT
ID-1	PRODUÇÃO, Mecânica		VB	-
	COMENTÁRIO: Tie-IV 06-01 (510.003): cortar linha e instalar CAP com uso de solda elétrica. Tie-IV 06-02 (1007.002): cortar linha e instalar CAP com uso de solda elétrica. Tie-IV 06-06 (401.115): cortar e modificar tubulação com solda.			
ID-1.1.3	PRODUÇÃO: Montar Andimes		VB	-
	COMENTÁRIO: montagem de 3,6 m³ no piso 18 m. Desmontagem de 6,12 m³ e 4,32 m³ no piso 6 m, e 7,2 m³ no piso 18 m			
ID-2.9.1.1	PRODUÇÃO: Desenergização /energização		VB	-
	COMENTÁRIO: Energização da PMA-2088 no piso 6 m; da PMA-129 no piso 6 m. Desenergização da PMA-161 no piso 6 m. Desconexão de cabo da HVK-4901 e da P-4905. Retirada de 32 m de cabo da HVK-4901, de 1,5 m da B-1200, de 1,5 m da B-1250, de 4 m da B-1200 e B1250			

EFETIVO DIRETO

Função	Tipo	Mobilizado	Presente	Falta	HE	HE	Acumulado	HE
AJUDANTE	MOD	-	2	0	17,6	0	329	0
ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE	MOD	-	1	0	8,8	0	114,4	0
ENCAIXADOR	MOD	-	1	0	8,8	0	168,8	0
MONTADOR DE ANDAIME	MOD	-	4	0	35,2	0	365,2	0
PEDREIRO	MOD	-	1	0	8,8	0	49,8	0
SOLDADOR	MOD	-	1	0	8,8	0	49,8	0
CALDERERO	MOD	-	-	-	-	-	61,6	0
ENCAIXADOR INDUSTRIAL	MOD	-	-	-	-	-	59,2	0

Seção de Ocorrência

 Este canal demonstra opções de cabeçalhos que podem ser inseridas dentro do .PDF para maior facilidade em gestão de dados.

OCORRÊNCIA



Opção 1:

Quadro informativo de fatos relevantes por área.

FATOS RELEVANTES

ENGENHARIA

001 - Prioridade: Normal | Status: Andamento

A gerência informa que houve problemas no equipamento!

OCORRÊNCIA



Opção 2:

Quadro informativo de fatos relevantes por área.

FATOS RELEVANTES - ENGENHARIA

001 -A gerência informa que houve problemas no equipamento!

FATOS RELEVANTES - PRODUÇÃO

001 -Canteiro da obra está com problemas de encanamento!

OCORRÊNCIA



Opção 3:

Quadro informativo de fatos relevantes por área.

FATOS RELEVANTES

ENGENHARIA

Ref.	Descrição
01	Disciplina: ENGENHARIA Local: Frente A Comentário: A gerência informa que houve problemas no equipamento!

FINANCEIRO

Ref.	Descrição
02	Disciplina: MOBILIZAÇÃO Local: Frente A Comentário: Canteiro da obra está com problemas de encanamento!

OCORRÊNCIA



Opção 4:

Quadro informativo de fatos relevantes por área.

Contendo duas colunas:
Descrição e Comentários do cliente.

FATOS RELEVANTES - Produção

Ref.	Descrição	Comentários Cliente
1	As atividades foram realizadas após liberação de área pela Segurança.	

FATOS RELEVANTES - Planejamento

Ref.	Descrição	Comentários Cliente
1	O Cronograma foi atualizado conforme demanda.	

Seção de Cabeçalhos




Este canal demonstra opções de cabeçalhos que podem ser inseridas dentro do .PDF para maior facilidade em gestão de dados.

CABEÇALHOS



Opção A - Cabeçalho:
Quadro de cabeçalho de forma resumida com os informativos principais:

- Descritivo da obra
- Prazo
- Gerenciadora
- Início e Término
- Gestor

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS			
<small>Formulário versão 09/PDF</small>			
Obra: BUILDING		RDO nº: BDG-1224	Data: 08/05/2019, Qua
Cliente: XWS		Gestor: João Medeiros	
Prazo: 1461 dias	INICIO	TERMINO	GERENCIADORA
Prazo incorrido: 1224 dias	01/01/2016	31/12/2019	-
Prazo faltante: 237 dias			

CABEÇALHOS



Opção B - Cabeçalho:
Quadro de cabeçalho de forma
detalhada com os informativos
principais:

- Descritivo da obra
- Prazo
- Gerenciadora
- Início e Término
- Gestor
- Modalidade Contratual
- Forma reduzida dos indicativos de paralisações e afins.


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS					
Obra: Modernização Industrias			Projeto: INDUSTR		Data: 28/11/2019, Qui
Valor: -	Contrato: 4600021822		RDO n.º: RDO-INDUSTR.0001		
Cliente: Modernização Unidades Industriais		Unidade: -	Gestor: José Medeiros		
Prazo: 731 dias	Prazo incorrido: 1 dias	Prazo faltante: 730 dias	Início: 28/11/2019	Término: 28/11/2021	Modalidade contratual: -
Pluviosidade: 0.0 mm	Condições da área: Operável	Houve acidente?: Não	Interrupção trabalho: Não	Status: APROVADO	Contratada: Ágil Engenharia

CABEÇALHOS



Opção C - Cabeçalho:
Quadro de cabeçalho de forma
mais reduzida possível com os
informativos principais:

- Descritivo da obra
- Prazo
- Contratada

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS nº: BDG-1237				
Formulário 09/PDF				
Obra: BUILDING				
-				
Contratante: XWS			Contratada: Ágil Engenharia	
Início atividades: 01/01/2016	PAC: 31/12/2019	Dias decorridos: 1237 dias	Dias restante: 224 dias	Data: Ter, 21/05/2019

CABEÇALHOS



Opção D - Cabeçalho:
Quadro de cabeçalho de forma
mais reduzida possível com os
informativos principais:

- Descritivo da obra
- Prazo
- Contratada

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Formulário versão 09/PDF




Escopo:	Terraplenagem e construção						
Contrato nº	RDO nº	Data Ordem Serviço	Data	Dia semana			
-	BDG-1237	01/01/2016	21/05/2019	Terça-feira			
Empresa contratada:	Ágil Engenharia		Responsável:	João Medeiros			
Obra:	BUILDING		Localidade:	São Paulo			
Prazo contratual	Dias corridos	Dias restantes	Dias atraso	Prorrogação (TAC)	Condição climática		
	31/12/2019	1237	224		-	Manhã: Bom	Tarde: Bom
					Noite: Bom		

CABEÇALHOS



Opção E - Cabeçalho:
Quadro de cabeçalho de forma
mais reduzida possível com os
informativos principais:

- Descritivo da obra
- Prazo
- Contratada


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS					
Projeto: BUILDING		RDO nº: BDG-1238	Data: 22/05/2019, Qua		
Escopo: Terraplenagem e construção		Cliente: XWS			
		Contratada: Ágil Engenharia			
Prazo	Dias transcorridos	Dias faltantes	Início	Término (TAD)	Semana
1461 dias	1238 dias	223 dias	01/01/2016	31/12/2019	178

CABEÇALHOS



Opção F - Cabeçalho:
Quadro de cabeçalho de forma
mais reduzida possível com os
informativos principais:

- Descritivo da obra
- Número do contrato
- Prazos
- Acidentes
- Contratada

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS						
Obra: INDUSTR			Projeto: RDO		Data: 30/04/2025, Qua	
Valor: R\$		Contrato: 123456		RDO n.º: RDO-.0514-RDO		
Cliente: Modernização Unidades Industriais			Unidade: -		Gestor: Leandro	
Prazo:	Prazo incorrido:	Prazo faltante:	Início:	Término:	Modalidade contratual:	
1981 dias	1981 dias	0 dias	28/11/2019	01/05/2025		
Pluviosidade:	Condições da área:	Houve acidente?:	Interrupção trabalho:	Status:	Contratada:	
0.0 mm	Operável	Não	Não		Ágil Engenharia	


CABEÇALHOS



Opção G - Cabeçalho:
Quadro de cabeçalho de forma
mais detalhada possível com os
informativos principais:

- Descritivo da obra
- Prazo
- Contratada
- Projeto
- Revenda
- Contratante

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Formulário versão 09/PDF				
Escopo:	Pavimentação/Drenagem								
Contrato nº 60214	RDO nº C.D.P.-0217-RDO		Data 10/09/2024	Dia semana Terça-feira					
REVENDA:	D.P.	Responsável: Antonio		Contratante: CTBrasil					
Projeto:	D.P.		Localidade:	Paraíba					
Prazo contratual 02/08/2025	Dias corridos 217		Dias restantes 325		Dias atraso -		Prorrogação (TAC) -		

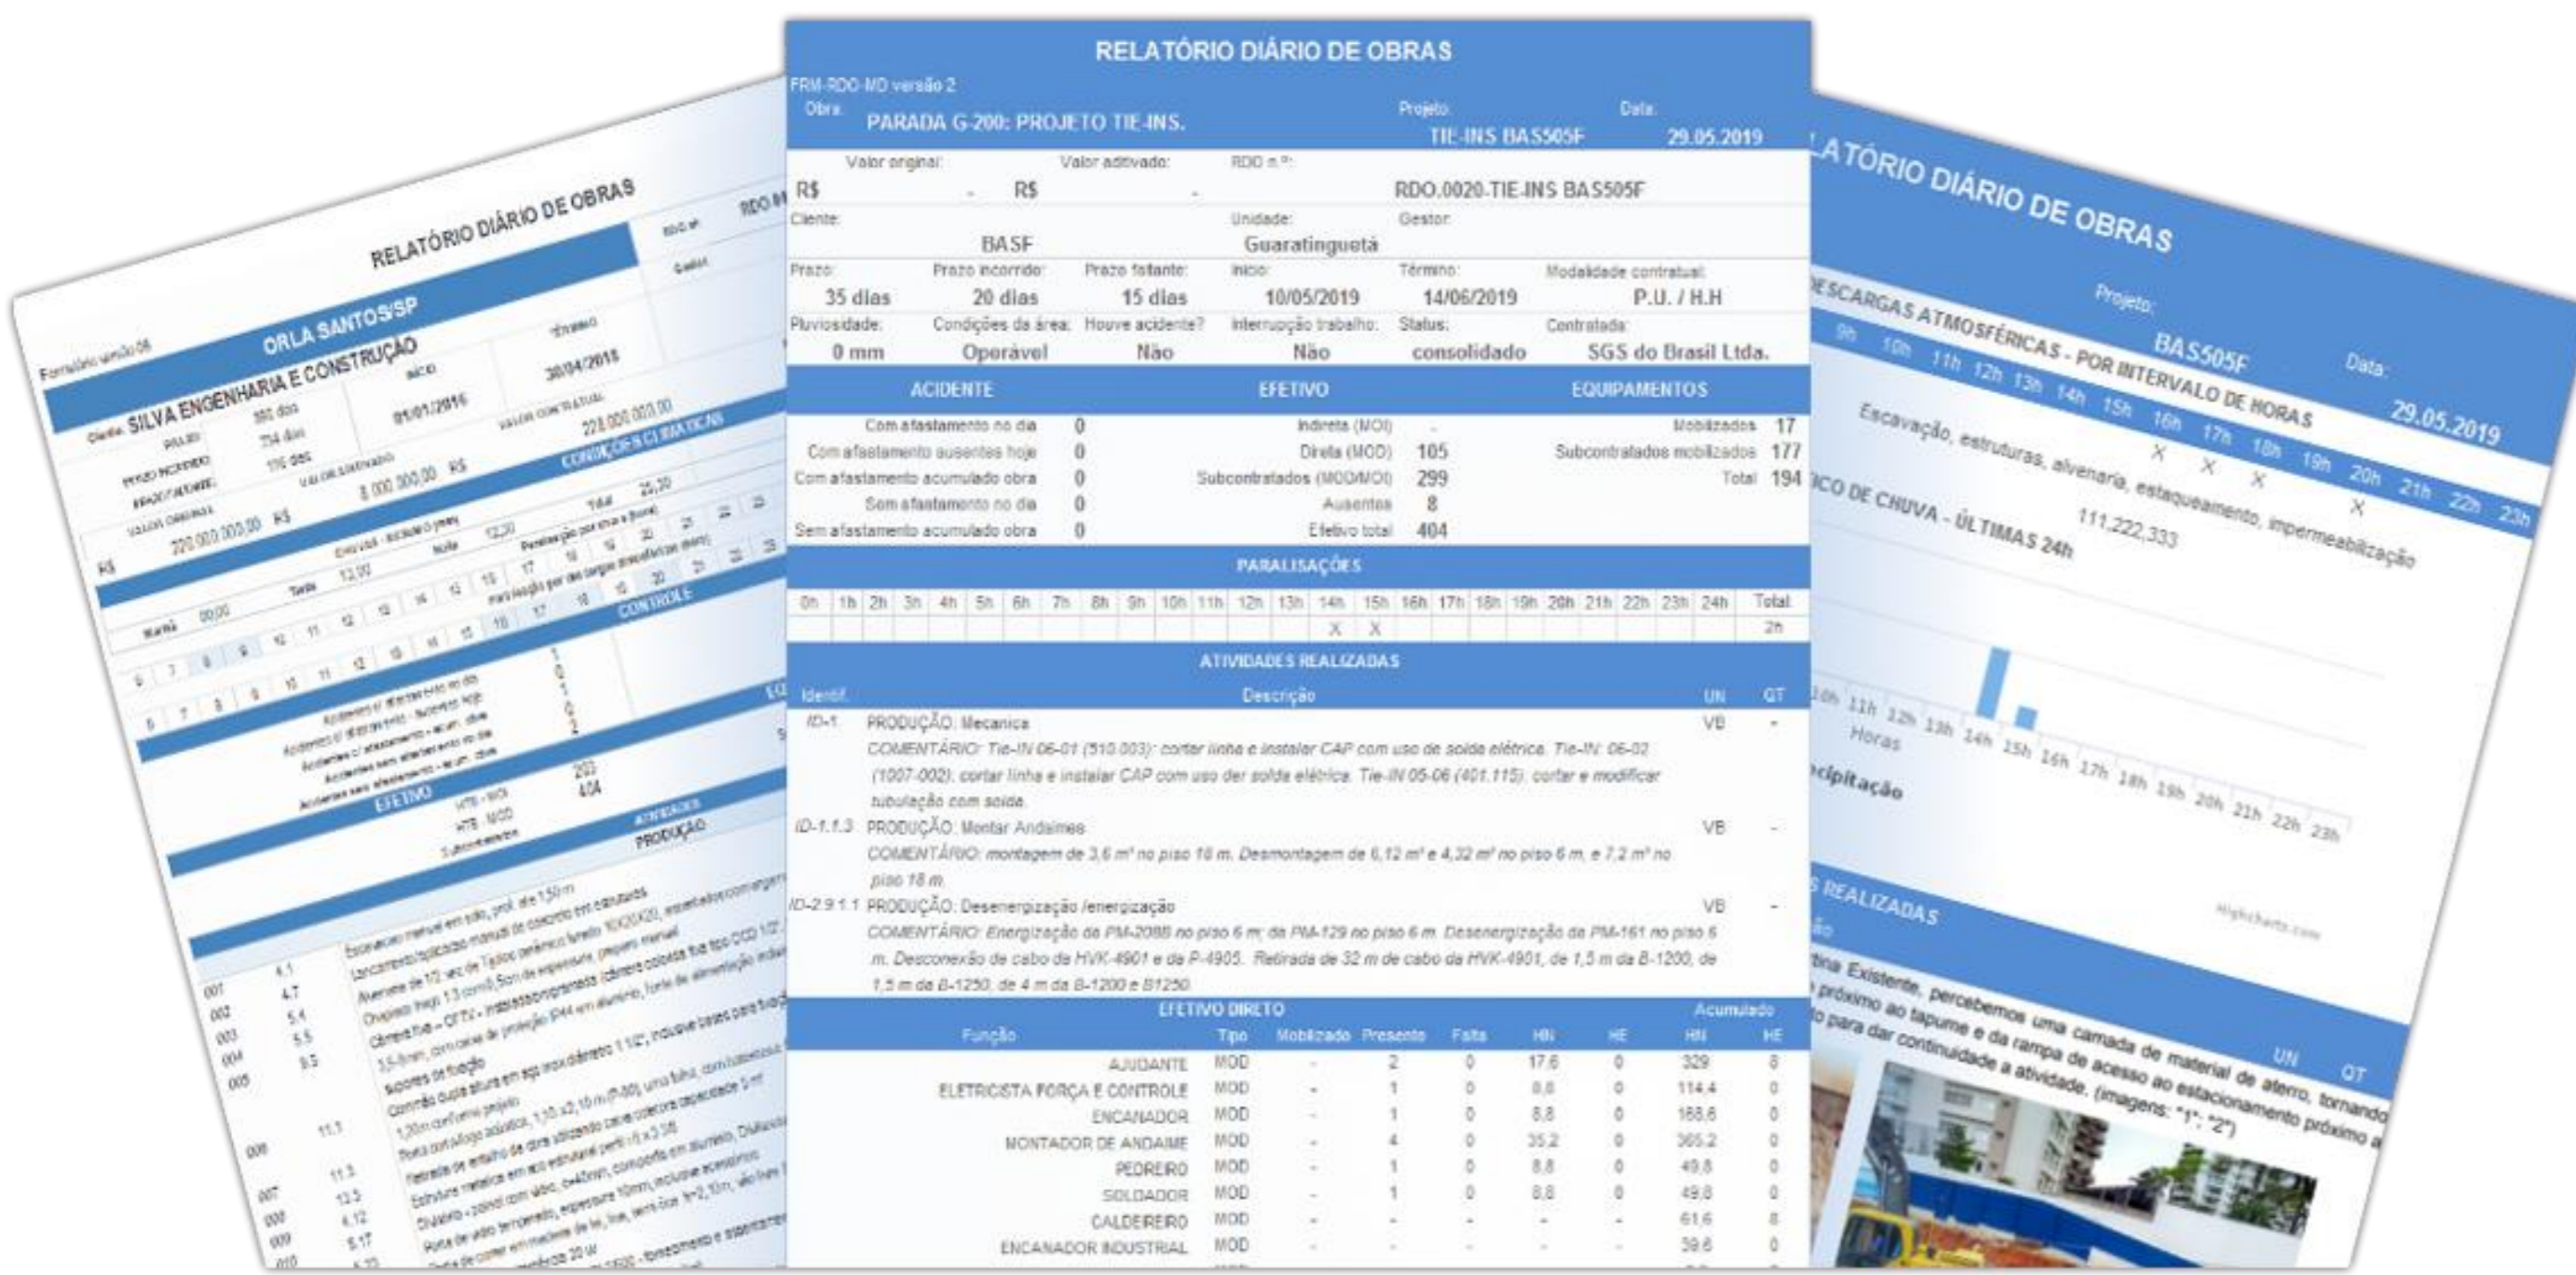

Seção de Conteúdo para Cabeçalhos



Este canal demonstra opções de informações a serem acrescentadas após o cabeçalho que podem ser inseridas dentro do .PDF para maior facilidade em gestão de dados.

INFORMAÇÕES



Opção 01:
Quadro de ocorrências informando de forma resumida sobre os quantitativos.

Estes quantitativos serão sobre os acidentes, efetivos, paralisações e equipamentos.

ACIDENTES		(resumo)	EFETIVO		(resumo)
Acidentes com afastamento no dia	0		EMPRESA - MOI	22	
Acidentes com afastamento - ausentes no dia	0		EMPRESA - MOD	13	
Acidentes com afastamento - acumulado obra	0		Subcontratados - MOI / MOD	7	
Acidentes sem afastamento no dia	0		Afastados	0	
Acidentes sem afastamento - acumulado obra	0		Efetivo total	42	
PARALISAÇÕES		(resumo)	EQUIPAMENTOS		(resumo)
Total acumulado de horas paralisadas no dia	3		EMPRESA- Equipamentos mobilizados	0	
Número de paralisações	1		Subcontratados - Equipamentos mobilizados	0	
			Equipamentos total	0	

INFORMAÇÕES



Opção 02:

Quadro para informar a produção acumulada ao longo do período anterior da obra.

Colunas informando o nome da atividade, o previsto a ser produzido, a quantidade atual executada e o cálculo percentual do acumulado da atividade.

PRODUÇÃO ACUMULADA POR ATIVIDADE

Atividades	Previsto	Executado	% Acumulado
Mobilização de equipes e equipamentos	35,00	32,00	91,43%
Serviço de sondagem	2.000,00	1.040,00	52,00%
Serviços iniciais	100,00	87,00	87,00%

INFORMAÇÕES



Opção 03:

Quadro para informar as condições do tempo com base com as informações inseridas no campo de pluviometria.

Colunas para acidentes, informando resumidamente as situações aplicadas.

Coluna para as condições de área com base das informações aplicada no RDO.

QUADRO RESUMO

CONDIÇÕES DO TEMPO	Manhã	Tarde	Noite	ACIDENTES		CONDIÇÕES DE ÁREA	
Incidência de raios	Não	Não	Não	Não houve	X	Operável	X
Vento (km/h) - max	<5	<10	<15	Sem afastamento	-	Parcialmente operável	
Temperatura (°C) - mín / max	18/23	23/27	27/20	Com afastamento	-	Inoperável	

INFORMAÇÕES



Opção 04:

Quadro informando a somatória total das horas normais e extras de todos os efetivos.

Com as somatórias diárias e o acumulado da semana vigente.

Horário de Trabalho					
Horas Normais			Horas Extras		
Diário:	350.00	Horas	Diário:	64.00	Horas
Acumulado Semanal	350.00	HORAS	Acumulado Semanal	64.00	HORAS

INFORMAÇÕES



Opção 05:

Quadro informando a quantidade de mão de obra do dia por empresa e a quantidade de horas Totais trabalhadas.

O quadro informa a separação por cada empresa da obra. E os cálculos são realizados de forma separadas. Apenas o cálculo total são unidos no dia.

RESUMO DO EFETIVO

Legenda: MO - Mão de obra HT - Horas totais no dia

EMPRESAS	dom,06/10		seg,07/10		ter,08/10		qua,09/10		qui,10/10		sex,11/10		sáb,12/10		MO Média	Total Horas
	MO	HT	MO	HT	MO	HT	MO	HT	MO	HT	MO	HT				
EMPRESA S.A	20	200	18	180	19	190	20	180	23	0	20	200	18	180	20	1130
TOTAL	20	200	18	180	19	190	20	180	23		20	200	18	180	20,0	1130

INFORMAÇÕES



Opção 06:

Quadro informativo referente aos documentos enviados e recebidos.

Informando se possui algum anexo ao RDO, Guias de Remessa de Documentos (GRD) foi emitida ou não e se Registro de não conformidade (RNC) foi lançada no RDO.

REGISTRO DE DOCUMENTOS ENVIADOS / RECEBIDOS

Anexos ao RDO: Sim Não

Emitida GRD: Sim Não

Registro de não conformidade: Sim Não

INFORMAÇÕES



Opção 07:

Quadro informativo referente a jornada, informando o horário de início e término do trabalho.

Informações sobre a condição atual da área, informando se a situação da obra está em Operável, Inoperável e Parcialmente operável.

Jornada: **07:00 as 16:00**

Condições de área:

Operável

Inoperável

Parcialmente operável

INFORMAÇÕES



Opção 08:

Quadro informativo referente a resumo, informando Pluviosidade, condições de área, acidente, interrupção de trabalho, status e Contratada.

Pluviosidade: 5.0 mm	Condições da área: Operável	Houve acidente?: Não	Interrupção trabalho: Não	Status:	Contratada: SUBCONTRATADA
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------

INFORMAÇÕES



Opção 09:

Quadro informativo referente a resumo de acidentes com e sem afastamento, efetivo (MOI e MOD), equipamento.

Informando a somatória de cada informação

ACIDENTE		EFETIVO		EQUIPAMENTOS	
Acidentes com afastamento no dia	0	Indireta (MOI)	9	Mobilizados	9
Com afastamento ausentes hoje	0	Direta (MOD)	12	Subcontratados mobilizados	0
Com afastamento acumulado obra	0	Subcontratados (MOD/MOI)	11	Total	9
Sem afastamento no dia	0	Ausentes	0		
Sem afastamento acumulado obra	0	Efetivo total	32		

INFORMAÇÕES



Opção 10:

Quadro informativo referente a resumo, informando Efetivo, Equipamento, Acidentes e paralisação.

Informando a somatória de cada informação

EFETIVO		EQUIPAMENTOS	
Indireto (MOI)	9	Equipamentos mobilizados	9
Direto (MOD)	12	Subcontratados - Equipamentos mobilizados	0
Subcontratados	11	Total equipamentos	9
Efetivo total	32		
ACIDENTES		PARALISAÇÕES	
Acidentes com afastamento	0	Total de horas	2
Acidentes sem afastamento	0	Tipos de paralisações	1

INFORMAÇÕES



Opção 11:

Quadro informativo referente a resumo. Informando Acidentes, Efetivo, Paralisação e Equipamento.

Informando a somatória de cada informação.

ACIDENTES		(resumo)	EFETIVO		(resumo)
Acidentes com afastamento no dia	0		Empresa - MOI	9	
Acidentes com afastamento - ausentes no dia	0		Empresa - MOD	12	
Acidentes com afastamento - acumulado obra	0		Subcontratados - MOI / MOD	11	
Acidentes sem afastamento no dia	0		Afastados	0	
Acidentes sem afastamento - acumulado obra	0		Efetivo total	32	
PARALISAÇÕES		(resumo)	EQUIPAMENTOS		(resumo)
Total acumulado de horas paralisadas no dia	2		Empresa- equipamentos mobilizados	9	
Número de paralisações	1		Subcontratados - equipamentos mobilizados	0	
			Equipamentos total	9	

INFORMAÇÕES



Opção 12:

Quadro informativo referente a resumo. Informando Acidentes, Efetivo, Efetivo Subcontratado, Paralisação e Equipamento.

Informando a somatória de cada informação.

ACIDENTES (resumo)		Efetivo (resumo)		Efetivo Subcontratado (resumo)	
Acidentes com afastamento no dia	0	Empresa - MOI	9	Subcontratados - MOI	0
Acidentes com afastamento - ausentes no dia	0	Empresa - MOD	12	Subcontratados - MOD	11
Acidentes com afastamento - acumulado obra	0	Total Empresa	21	Subcontratados total	11
Acidentes sem afastamento no dia	0	Afastados	0		
Acidentes sem afastamento - acumulado obra	0	Total liquido Empresa	21		
PARALISAÇÕES (resumo)		EQUIPAMENTOS (resumo)			
Total acumulado de horas paralisadas no dia	2	Empresa- Equipamentos mobilizados		9	
Número de paralisações	1	Subcontratados - Equipamentos mobilizados		0	
		Equipamentos total		9	

INFORMAÇÕES



Opção 13:

Quadro informativo referente a resumo. Informando Subcontratada, Gestor, Contrato, Escopo e Prazo Contratual.

Informando a somatória de cada informação.

Contratada:	SUBCONTRATADA					
Gestor da Contratada:	Rafael de Assis Rodrigues					
Contrato:	1.24.01307					
Escopo:	Serviços de fornecimento, montagem/transporte de 2 módulos habitacionais termoacústicos ? LINHA T e estruturas executadas em Steel Frame.					
Prazo contratual:	Início:	26/09/2024	Término:	25/11/2024	DATA DO RDO	14/10/2024
	Prazo decorrido		Total de dias			
	19		61			

INFORMAÇÕES



Opção 14:

Quadro informativo referente a resumo a condições do tempo/pluviometria.

E somatória total em mm.

Condições do Tempo:	Manhã	Ensolarado	Parcial nublado	Garoa	Chuva leve	Chuva forte	Leitura	5
	Tarde	Ensolarado	Parcial nublado	Garoa	Chuva leve	Chuva forte	Pluviômetro	0
	Noite	Ensolarado	Parcial nublado	Garoa	Chuva leve	Chuva forte		0
							Total (mm)	5.00

INFORMAÇÕES



Opção 15:

Quadro informativo referente a precipitação por resíduo do período.

Valores da pluviometria, manhã, tarde e noite. Total, acumulado mês e mês anterior.

PRECIPITAÇÃO - RESUMO DO PERÍODO (mm)

Manhã: 5,00 mm	Tarde: 0,00 mm	Noite: 0,00 mm	Total: 5,00 mm	Acumulado mês: 5,00 mm	Acumulado mês anterior: 0,00 mm
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	--

INFORMAÇÕES



Opção 16:

Quadro informativo para que possa ser demonstrado quais permissões de trabalho estão vinculados ao RDO.

Com os campos do identificador da PT, Emissão e Revalidação dela, quem foi o emitente da PT e o horário acerca dela, e também caso tenha interrupção nela.

PERMISSÃO DE TRABALHO / PT

Identificador	Emissão	Revalidação	Emitente	Hora solíc.	Hora emiss.	Interrupção
PT	27/09/2024	01/10/2024	RDOWEB	08:00	08:20	-
PT_CORINGA	30/09/2024	02/10/2024	RDOWEB	08:00	08:20	-

INFORMAÇÕES



Opção 17:

Quadro informativo sobre o insumo.

Coluna informando o insumo consumido no dia, a unidade e o total do insumo.

INSUMOS - Produção

Ref.	Identificador	Descrição	Unid.	Total
001		Adubo Orgânico	kg	35,00
002		Arame farpado	m	15,00
003		Arame liso	m	10,00
004		Parafuso 3/4"	pc	5,00

INFORMAÇÕES




Opção 18:

Quadro de Resumo

Informando Condições do Tempo (manhã, tarde e noite) Acidentes e Condições de Área.

QUADRO RESUMO

CONDIÇÕES DO TEMPO	Manhã	Tarde	Noite	ACIDENTES		CONDIÇÕES DE ÁREA	
Tempo bom				Não houve	X	Operável	X
Chuva leve				Sem afastamento	-	Parcialmente operável	
Chuva forte				Com afastamento	-	Inoperável	

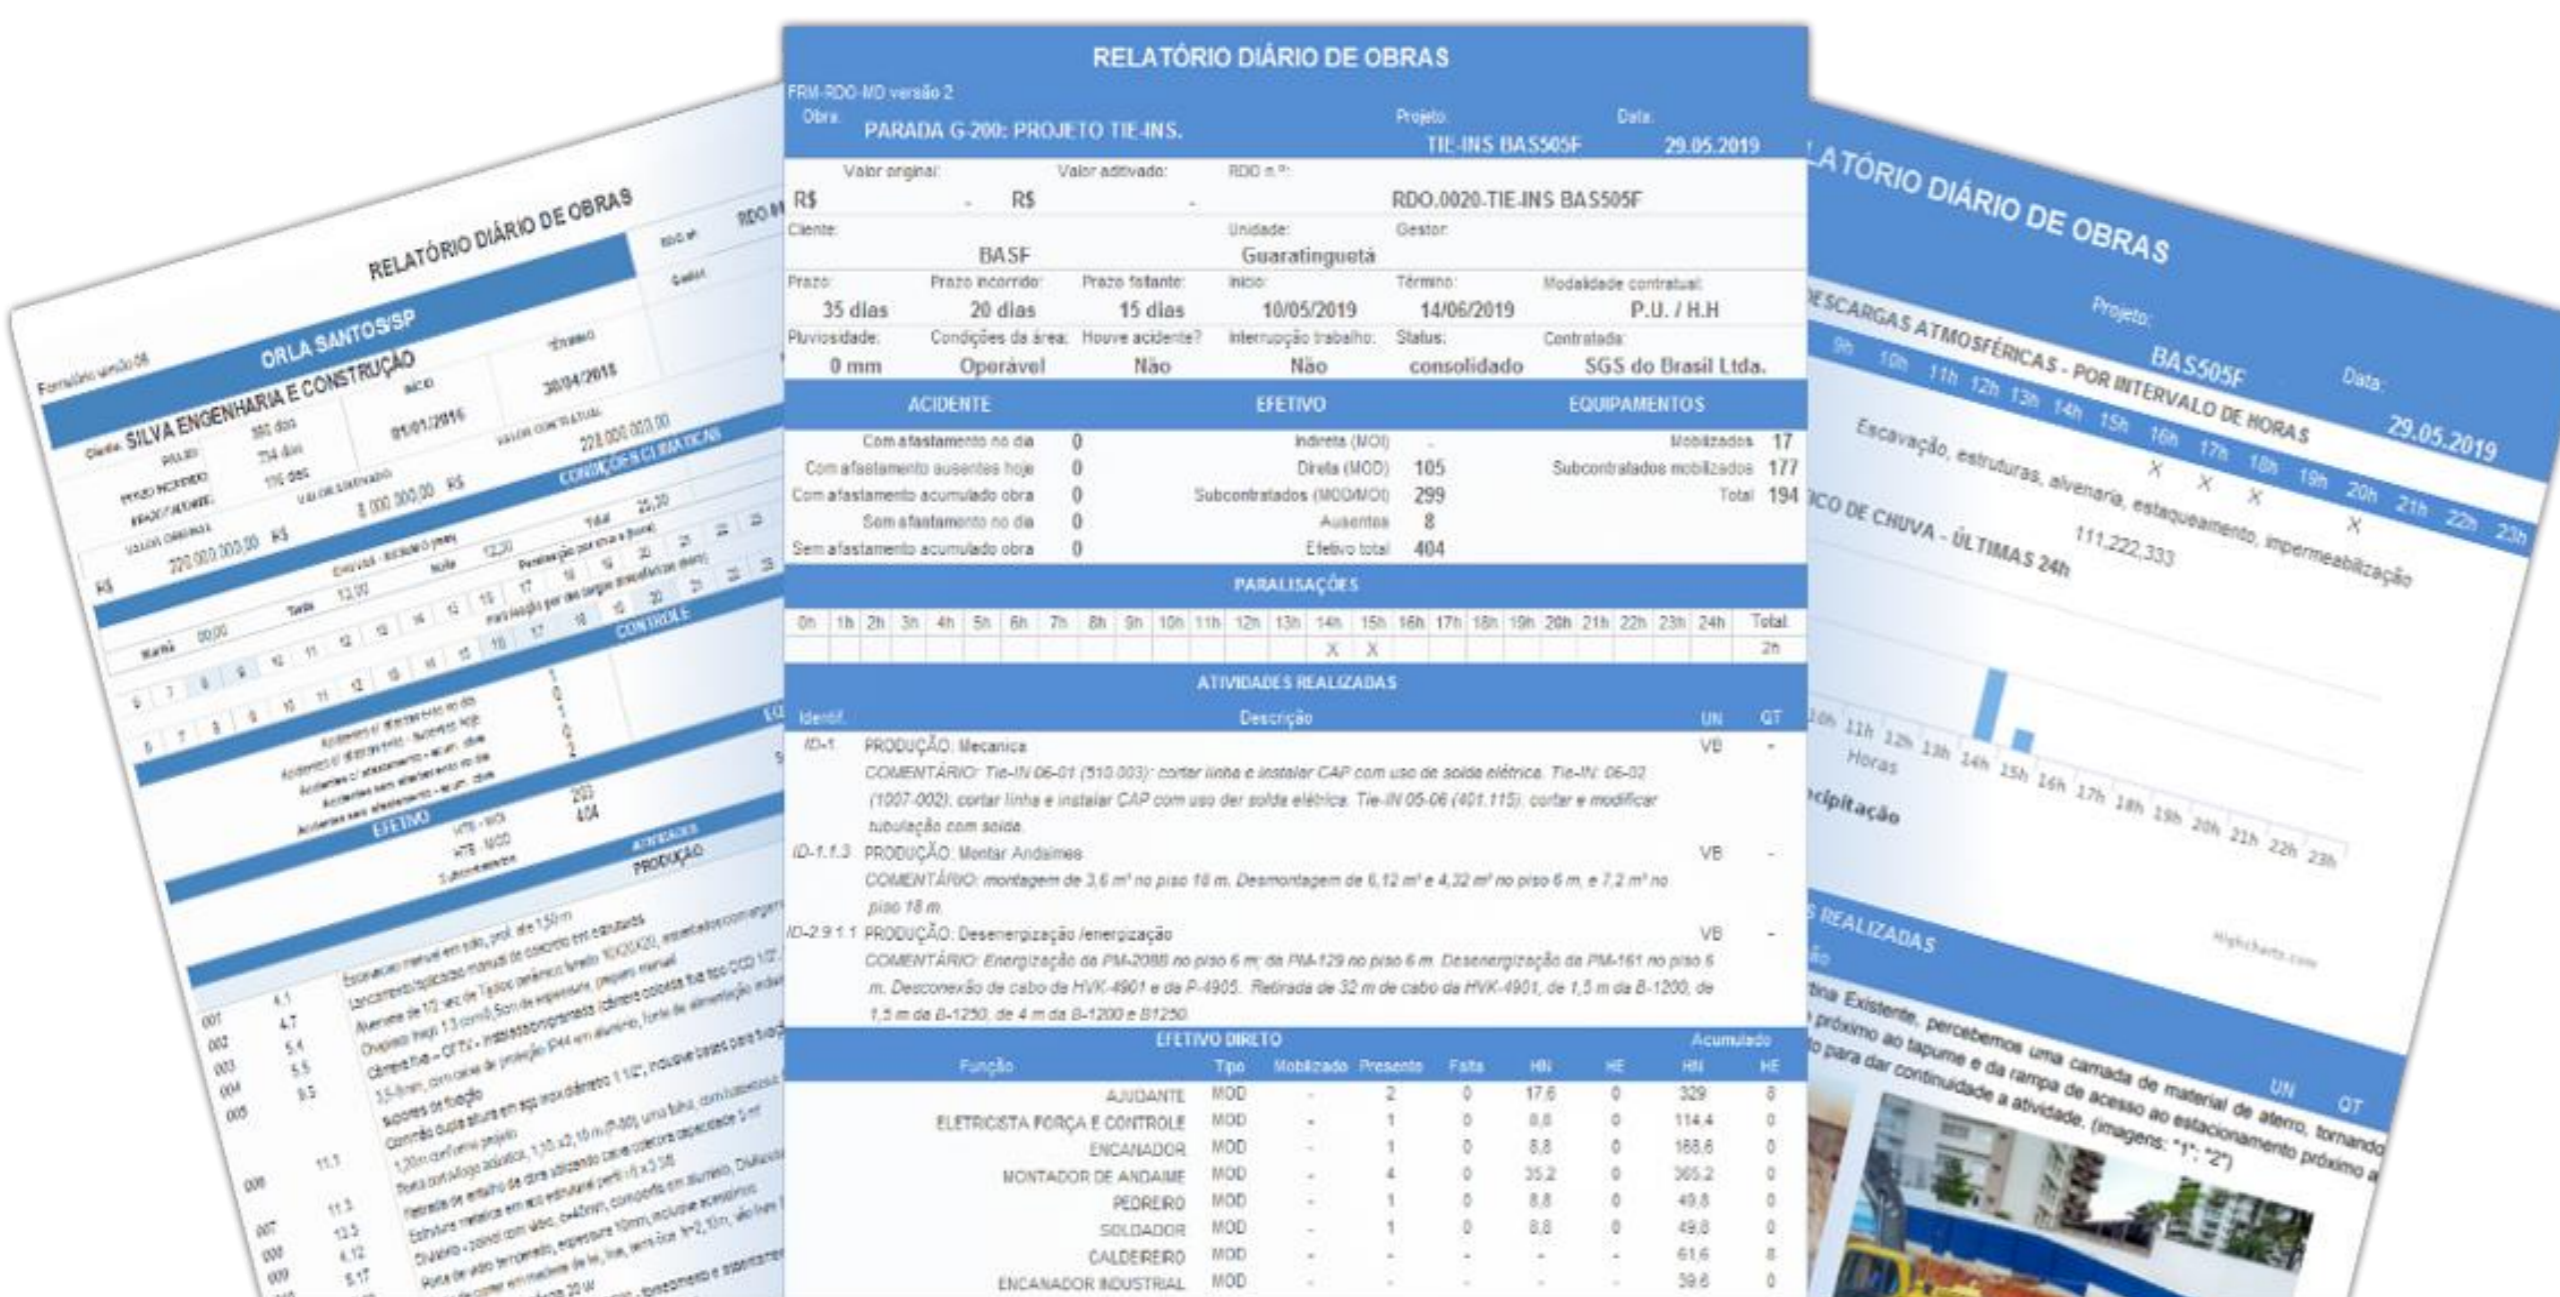

Seção de Rodapés






Este canal demonstra opções de Rodapés que podem ser inseridas dentro do .PDF para maior facilidade em gestão de dados.

INFORMAÇÕES



Rodapé A – 4 Assinaturas:
Rodapé com 4 Assinaturas.

Rodapé com as assinaturas do:
ADM - Admin. (Interno)
GER - Gerente (Interno)
CLA - Cliente Gestor (Externo)
CLG - Cliente Gerente (Externo)





EMITENTE	CONTRATADA 2	GERENCIADORA	CONTRATANTE	Paginação
Consolidado em 24/04/2024 13:52:59 por usuarioteste8  ef07be64d27124d144619bc144df81b0	—	—	Aprovado em 27/05/2024 10:41:46 por clienteteste3  412b417112c0920ef73f78d12f8985b5	Pág.1 de 3 

INFORMAÇÕES



Rodapé B – 3 Assinaturas:
Rodapé com 3 Assinaturas.

Rodapé com as assinaturas do:
GER - Gerente (Interno)
CLA - Cliente Gestor (Externo)
CLG - Cliente Gerente (Externo)




EMITENTE	GERENCIADORA	CONTRATANTE	Paginação
<p>João Medeiros</p> <p>Consolidado em 21/08/2024 13:59:16 por daniela@webdutos</p>  <p>c20d683aa1fb6506982eea7edcfeeb08</p>	<p>clienteteste2 - 04/09/2024 09:26:00</p>  <p>e8039b32a91f9242231ec55ef9033c26</p>	<p>José Torres</p> <p>Aprovado em 04/09/2024 12:28:24 por clienteteste3</p>  <p>f3b3961e505af123a1bcac15b85d61ad</p>	<p>Pág.1 de 3</p> 

INFORMAÇÕES



Rodapé C – 2 Assinaturas:
Rodapé com 2 Assinaturas.

Rodapé com as assinaturas do:
GER - Gerente (Interno)
CLG - Cliente Gerente (Externo)

EMITENTE	CONTRATANTE	Paginação
<p data-bbox="359 896 593 924">João Medeiros</p> <p data-bbox="303 977 643 1020">Consolidado em 21/08/2024 13:59:16 por daniela@webdutos</p>  <p data-bbox="283 1071 643 1089">c20d683aa1fb6506982eea7edcfeeb08</p>	<p data-bbox="1412 896 1602 924">José Torres</p> <p data-bbox="1359 977 1682 1020">Aprovado em 04/09/2024 12:28:24 por clienteteste3</p>  <p data-bbox="1332 1071 1692 1089">f3b3961e505af123a1bcac15b85d61ad</p>	<p data-bbox="2025 877 2099 939">Pág.1 de 1</p> 

INFORMAÇÕES



Rodapé D– 2 Assinaturas:
Rodapé com 2 Assinaturas.

Rodapé com as assinaturas do:
GER - Gerente (Interno)
CLA - Gerenciadora
CLA - Contratante

EMITENTE	INTERVENIENTE	CONTRATANTE	Paginação
Alex Emitente <small>Consolidado em 15/10/2025 14:30:44 UTC-3 por alexsander@app_1</small>  <small>53c2230e474699d0425b9c68922b23fc</small>	Álvaro <small>Conferido em 15/10/2025 11:37:18 por homolog@cla2</small>  <small>2a4be9dc96502af3093453af7738fbb5</small>	Leonardo Sobral <small>Consolidado em 22/04/2021 18:22:35 UTC-3 por _leandro.sobral</small>  <small>3bf12ec65ebd6011082b7fa54b35adb8</small>	Pág.1 de 2 



Seção de Paralisações



Este canal demonstra onde evidenciar as paralisações que podem ser inseridas dentro do .PDF para maior facilidade em gestão de dados.

PARALISAÇÃO



Opção 1:
Quadro informativo sobre o paralisação.

Quadro utilizando de que horário ocorreu-se a paralisação, a quantidade total de horas paralisadas, as frentes e mão de obras paralisadas, local e comentários acerca da paralisação em específico.

PARALISAÇÕES REGISTRADAS NO DIA

Falta de Material (horas)

6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	0h	1h	2h	3h	4h	5h	Total: 2h
Frentes paralisadas: Canteiro 1													Local:											
Mão de obra paralisada: Equipe Canteiro 1																								
Comentarios: Havia somente 1/4 do material necessário																								

PARALISAÇÃO



Opção 2:

Quadro de equipamentos paralisados por Empresa e informando o motivo da paralisação, quantidade de horas paradas.

Informativo da quantidade total de equipamento e a somatória total de horas paradas a todos equipamentos.

EQUIPAMENTO PARALISADO						
-	Equipamento	Tag	Quant.	Hora Parada p/und	Paralisação	Empresa
01	Betoneira elétrica 600		3	4h	Auditoria de segurança	EMPRESA S.A
02	AUTO-BETONEIRA		1	4h	Auditoria de segurança	EMPRESA S.A
03	BOMBA D'AGUA		2	4h	Auditoria de segurança	EMPRESA S.A
04	BOMBA SUBMERSA		3	4h	Auditoria de segurança	EMPRESA S.A
05	CAMINHÃO BASCULANTE 12M³		1	4h	Auditoria de segurança	EMPRESA S.A
06	BOMBA DE SUCÇÃO		2	4h	Auditoria de segurança	EMPRESA S.A
07	Aspirador Água e Pó		1	4h	Auditoria de segurança	EMPRESA S.A

PARALISAÇÃO



Opção 3:

Quadro de efetivo paralisados, informando o tipo (MOD & MOI), quantidade de efetivos do cargo paralisado, quantidade de horas paralisadas, motivo da paralisação e a empresa que o efetivo pertence.

Linha informando o total de efetivo paralisados e a quantidade total de horas paradas para todos os efetivos.

EFETIVO PARALISADO

-	Cargo	Tipo	Quant.	H. Paradas	Paralisação	Empresa
01	Ajudante Geral	MOD	2	3h	Aguardando Material	EMPRESA S.A
02	Ajudante Operação	MOD	1	3h	Aguardando Material	EMPRESA S.A
03	Acabador de Drywall	MOD	2	3h	Aguardando Material	EMPRESA S.A
04	1/2 Oficial de Pedreiro	MOD	1	3h	Aguardando Material	EMPRESA S.A
05	Ajudante de Almojarifado	MOD	2	3h	Aguardando Material	EMPRESA S.A
-	Total:		8	15h		

PARALISAÇÃO



Opção 4:

Quadro informativo de frentes paralisadas, mão de obra paralisadas, comentários, e locais.

Informando horas afetadas e somatória total.

PARALISAÇÕES

Aguardando Material (Evento superveniente / horas)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	Total: 7h
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	-----------

Frentes paralisadas:	Canteiro norte.	Local: Frente A
----------------------	-----------------	-----------------

Mão de obra paralisada:	equipe 3
-------------------------	----------

Comentários:	Houve uma espera para chegada do material necessário.
--------------	---

PARALISAÇÃO



Opção 5:

Quadro informativo sobre o paralisação.

Quadro utilizando de que horário ocorreu-se a paralisação, as frentes e mão de obras paralisadas, local e comentários acerca da paralisação em específico.

Este quadro não exhibe o total de horas paralisadas.

PARALISAÇÕES

Aguardando liberação de PT	(horas)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5		
Frentes paralisadas:																										Local:	
Mão de obra paralisada:																											
Comentários:		08:00 - 11:00 - Aguardando liberação de PT, aguardando manobras operacionais																									

PARALISAÇÃO



Opção 6:

Quadro informativo demonstrando mão de obra, equipe, comentários.

Horas paralisadas e total.

PARALISAÇÕES

Aguardando Material (Evento superveniente / horas)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	Total: 7h
Mão de obra paralisada: equipe 3	Comentários: Houve uma espera para chegada do material necessário.																								

PARALISAÇÃO



Opção 6:

Quadro informativo demonstrando mão de obra, equipe, comentários.

Horas paralisadas e total.

Cargos dos Efetivos Paralisados e quantidade total.

PARALISAÇÕES																												
Falta de Material		(horas)		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	Total: 2h
Frentes paralisadas:											Local:																	
Mão de obra paralisada:				Equipe A																								
Comentários:				No retorno chegaram carga de novos materiais																								
EFETIVO PARALISADO																												
-	Cargo	Tipo	Quant.	H. Paradas	Paralisação																		Empresa					
01	Auxiliar Técnico	MOI	1	0h	Falta de Material																		Geoprojetos					
02	Engenheiro Civil	MOI	1	0h	Falta de Material																		Geoprojetos					
03	Técnico de Segurança do Trabalho	MOI	1	0h	Falta de Material																		Geoprojetos					
-	Total:		3	0h																								

Principais Recursos

RDOs digitais, com validade jurídica, para qualquer tipo de obra.



MÃO DE OBRA

- Produtividade em modo gráfico ou tabular, controle de efetivo por homem, por cargo, equipe, etc.



CLIMA

- Pluviosidade (real e média histórica)
- Vento, umidade, temperatura
- Integração com estação pluviométrica



PARALISAÇÕES

- Decorrência de chuva, motivos legais, terreno impraticável, greve, solicitação fiscais - gerenciadora - vizinhos, etc.



SUBCONTRATADAS

- Cadastro de todas empresas participantes dos empreendimentos, segmentação de efetivo e equipamentos por empresas.

OCORRÊNCIAS

- Registro de fatos relevantes à obra
- Réplicas, comentários e notificações
- Classificação de importância



ATIVIDADES

- Cronograma ou EAP/WBS
- Curva S, produção, saldo quantitativo e de valores



EQUIPAMENTOS

- Inventário de equipamentos NR12
- Controle de apontamentos
- Apropriações e histogramas




WORKFLOW DE APROVAÇÃO

- Fluxo de informações controlado
- Emissão de diários sem papel e com certificado digital.



ACIDENTES

- Registro de acidentes em conformidade com 1.094 CONFEA.
- Cálculo de ausência e retorno

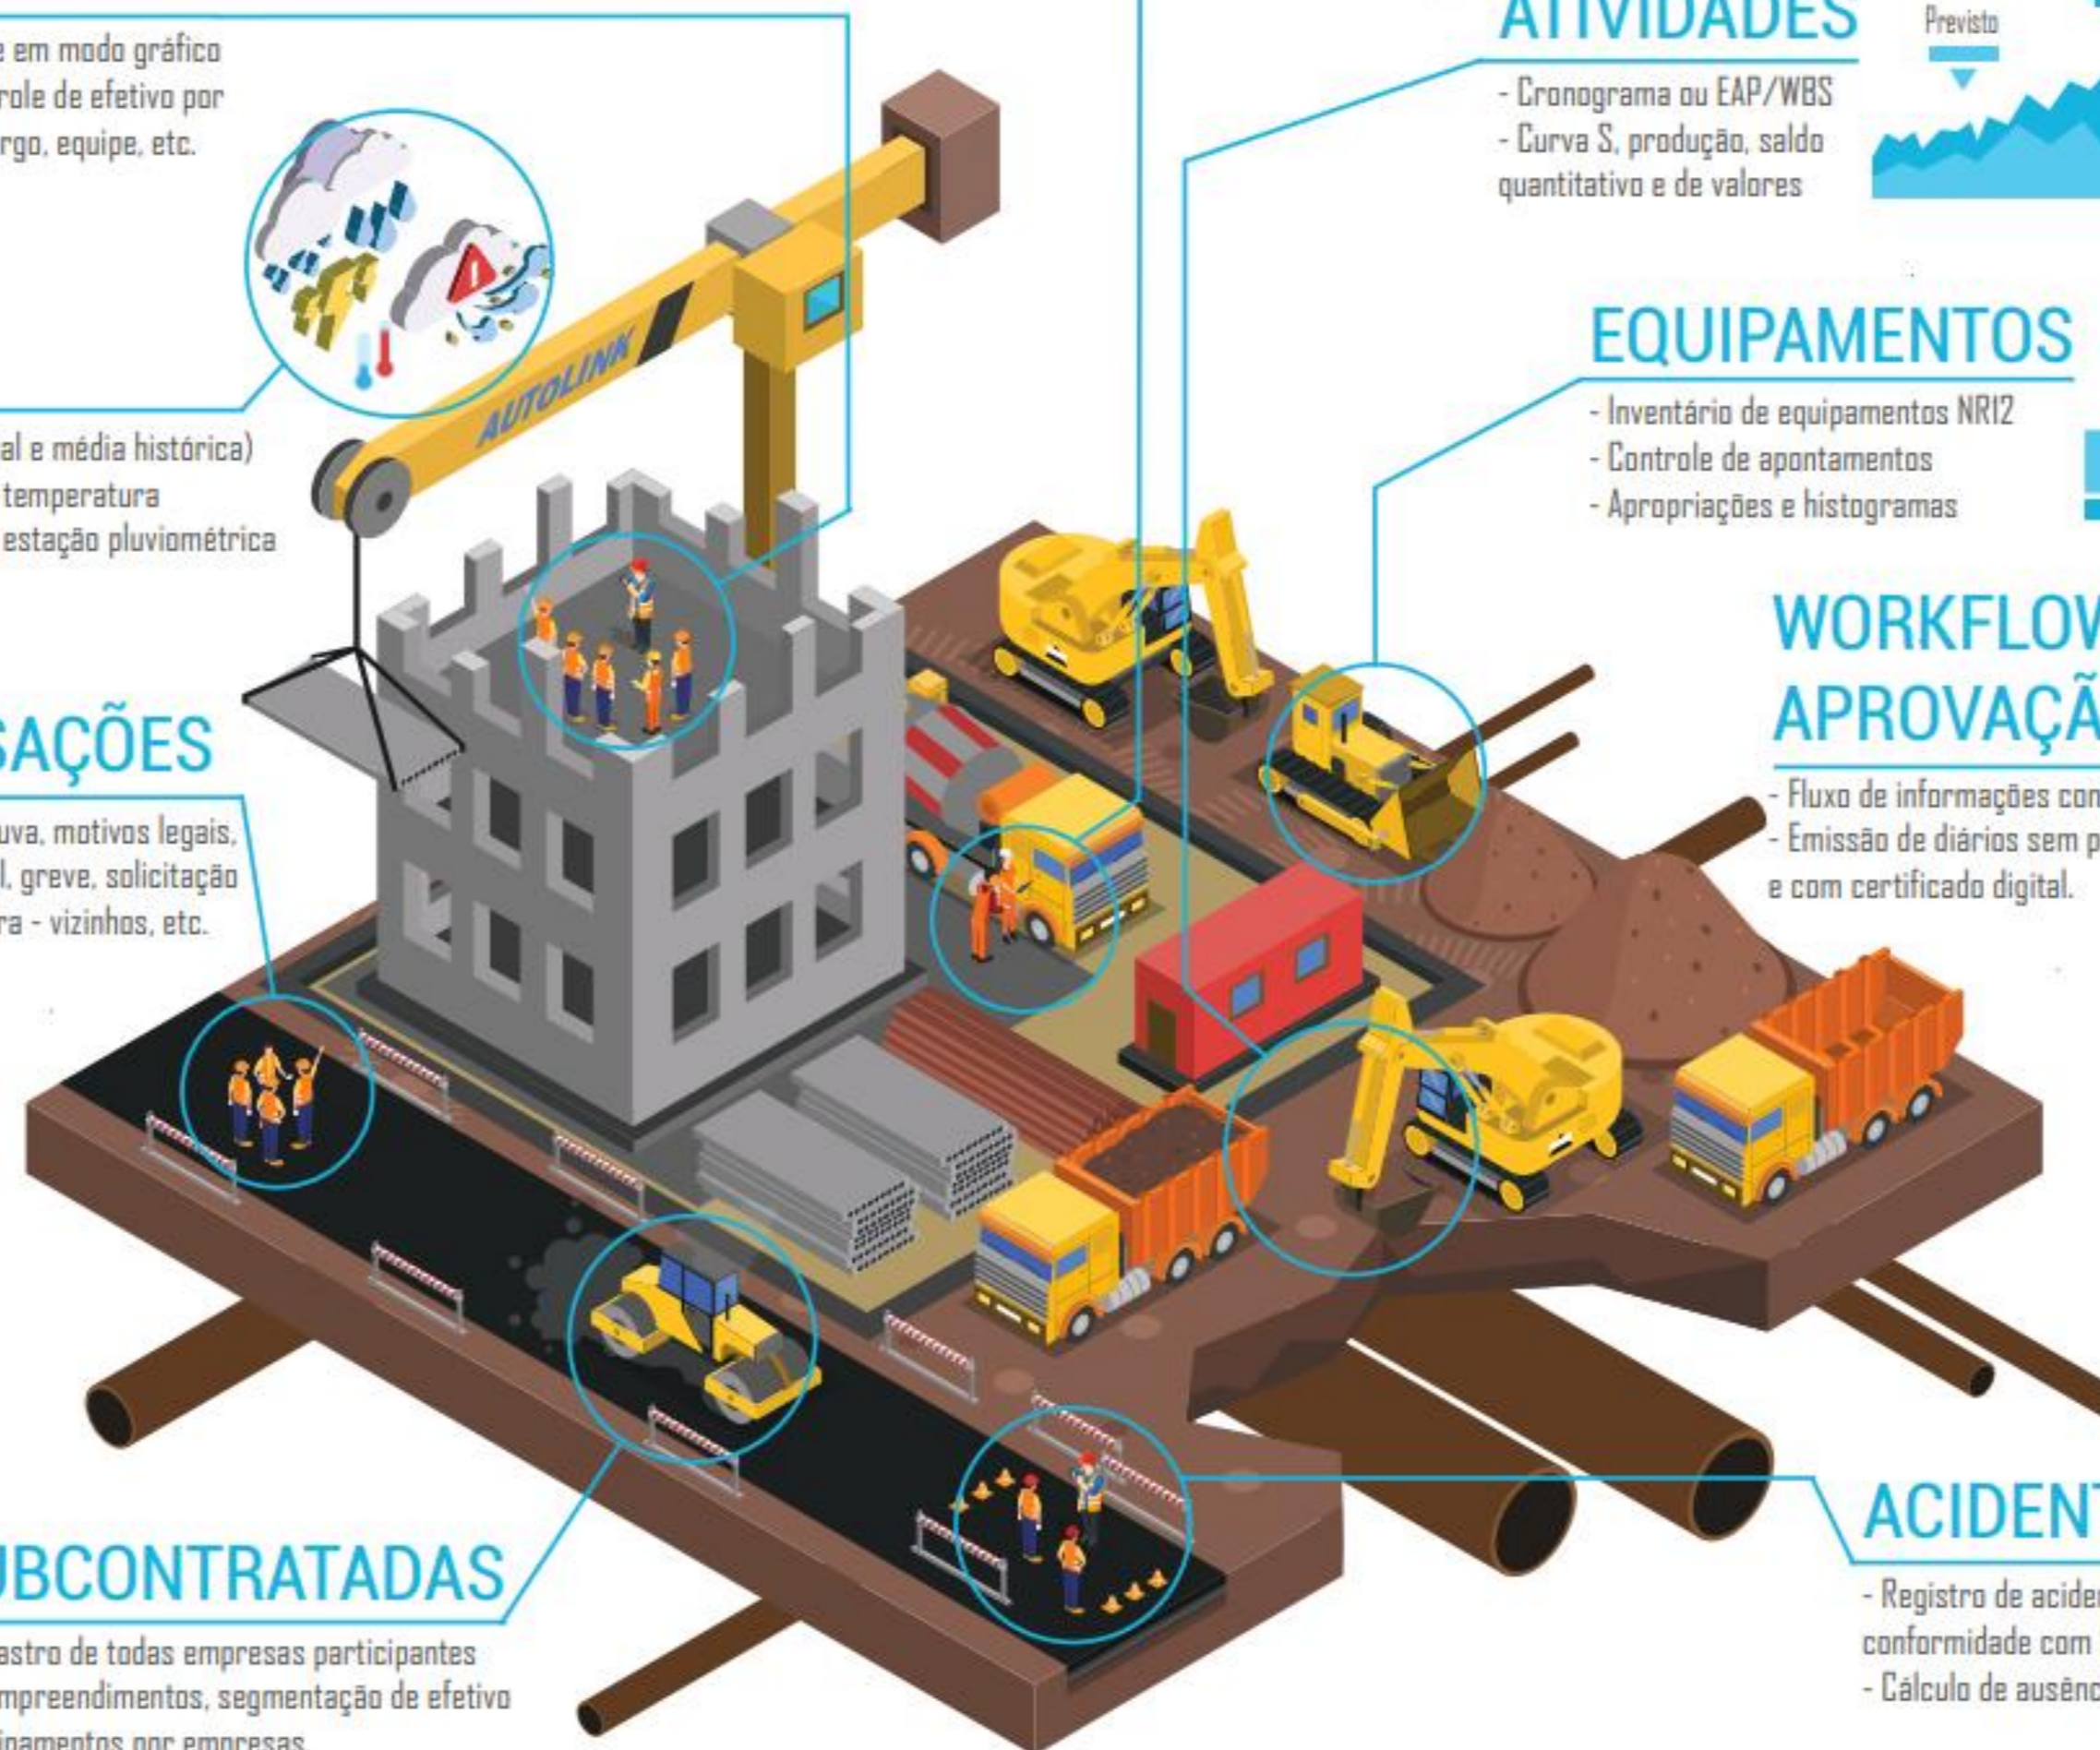

RDOWEB

Obras cob controle



OBRIGADO

Para saber mais, visite nosso website ou solicite uma Apresentação técnica sem compromisso.

www.webdutos.com.br | www.rdoweb.com.br
